

今こんなことをしています。

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、運動場棟(C棟)は土工事が完了し、基礎足場を設置した後、②工区より基礎配筋組立と基礎型枠工事を進めております。足場・鉄筋・型枠材料は西側の各種クレーンで運んでおります。3月からコンクリート打設の予定で施工を進めております。管理棟(A棟)は土工事を①工区より開始し施工しております。

掘削した残土は西側の第4ゲートから工事車輛(ダンプ)で搬出してしております。

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますようお願い申し上げます。

記

| | | |
|-------|--------------------|--------------|
| C棟②工区 | 基礎ピット底盤コンクリート打設予定日 | 令和5年3月 3日(金) |
| C棟②工区 | 基礎コンクリート打設予定日 | 令和5年3月 9日(木) |
| C棟②工区 | 基礎コンクリート打設予定日 | 令和5年4月 7日(水) |
| C棟①工区 | 基礎ピット底盤コンクリート打設予定日 | 令和5年3月 9日(木) |
| C棟①工区 | 基礎コンクリート打設予定日 | 令和5年3月16日(木) |
| C棟①工区 | 基礎コンクリート打設予定日 | 令和5年4月 7日(水) |
| A棟①工区 | 基礎ピット底盤コンクリート打設予定日 | 令和5年3月31日(金) |
| A棟①工区 | 基礎コンクリート打設予定日 | 令和5年4月13日(木) |
| A棟②工区 | 基礎ピット底盤コンクリート打設予定日 | 令和5年4月13日(木) |



C棟配筋施工状況



C棟型枠施工状況



A棟土工事掘削状況




クレーン作業状況



現場担当の太田優太です。
現場での品質管理・写真管理を行っております。良い品質の建物ができるように頑張ります。
宜しくお願いします。

現在の工事進捗率 13%

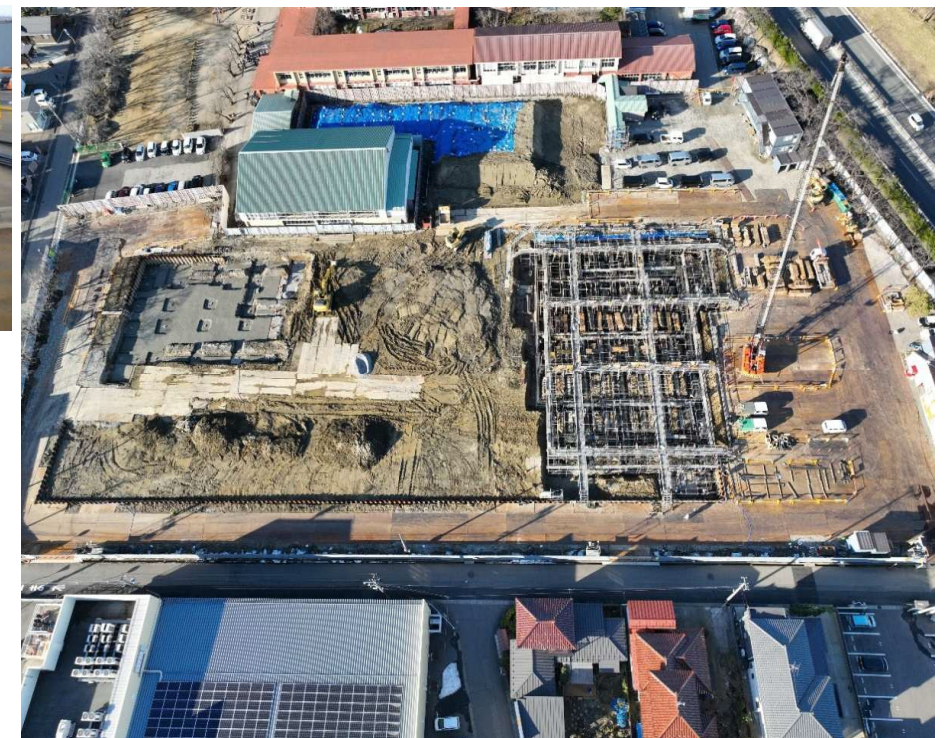

土工事開始状況を上空から撮影した写真です。



各棟は工区を分けて施工します。
A棟 ①～③工区
B棟 ①～③工区
C棟 ①～②工区
D棟 ①工区

