

地域の皆様へ

お知らせ第 10 号
発行 令和5年8月

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「朝陽第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、運動場棟（C棟）は2工区は最上階まで打設が完了し、1工区は8月下旬の最上階コンクリート打設に向けて鉄筋型枠工事を進めております。

管理棟（A棟）は2, 3工区の1階躯体コンクリート打設に向けて鉄筋型枠工事を進めております。


校舎棟（B棟）は1工区が1階スラブ、2, 3工区は1階躯体コンクリート打設に向けて鉄筋型枠工事を進めております。

引き続き躯体工事に伴い、頻繁に大型車両が出入りいたします。

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力頂きますようお願い申し上げます。

記

C棟②工区	2-R階躯体コンクリート打設完了	令和5年8月上旬
C棟①工区	2-R階躯体コンクリート打設予定日	令和5年8月下旬
A棟②工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年9月上旬
A棟③工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年9月中旬
B棟③工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年9月中旬
B棟①工区	1階床スラブコンクリート打設予定日	令和5年8月下旬

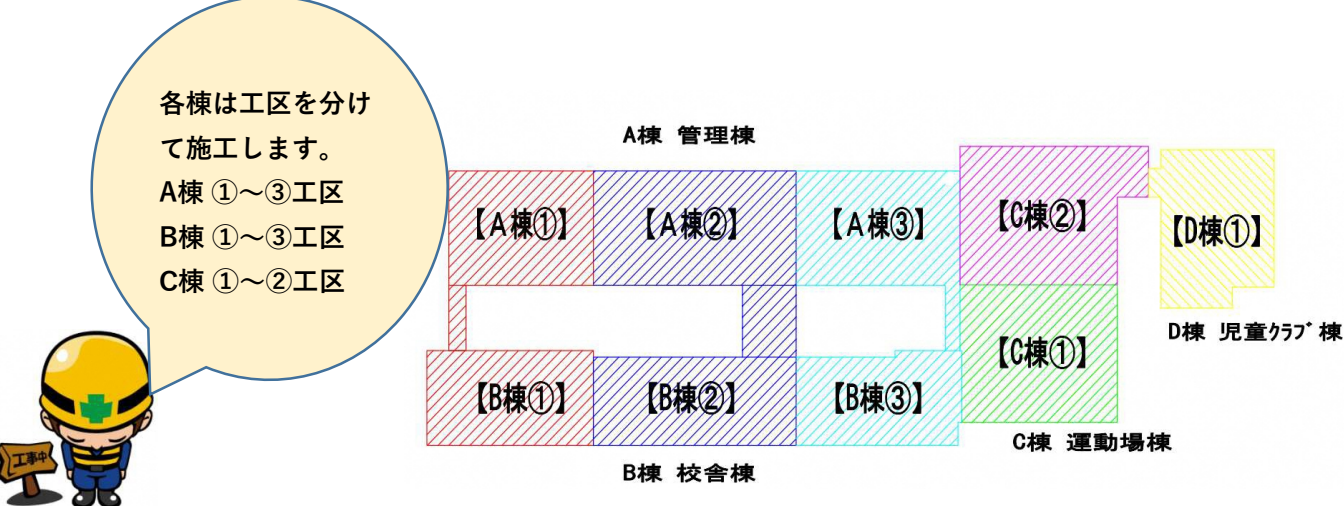

今こんなことをしています。



A棟 コンクリート打設状況



A棟 1階躯体配筋型枠状況



運動広場 外構工事施工状況



B棟 1F床スラブ施工状況



C棟 外観



安全週間(安全教育・訓練)



現場担当の石川 雄大です。
主に、職場の安全管理と施工管理を担当しております。
まだまだ暑い日が続きますが、職人さんとコミュニケーションを取りながら、安全に施工を行っています。

現在の工事進捗率 41%



施工状況を上空から撮影した写真です。
