

# 今こんなことをしています。

## ★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、運動場棟(C棟)は1階躯体が終わり、2階躯体の鉄筋型枠工事を行っております。

管理棟(A棟)の①②工区は1階躯体の鉄筋型枠工事が進んでいます。

③工区は基礎工事を終え、1階躯体工事へ進んでいきます。

校舎棟(B棟)③工区は基礎コンクリート打設完了、①②工区は②の方から基礎型枠工事を進めております。


今後も校舎棟(B棟)・管理棟(A棟)・運動場棟(C棟)のコンクリート工事で大型車両が今まで以上に頻繁に出入りいたします。

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力頂きますようお願い申し上げます。

### 記

C棟②工区	2階躯体コンクリート打設予定日	令和5年7月下旬
C棟①工区	2階躯体コンクリート打設予定日	令和5年8月上旬
A棟①工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年7月中旬
A棟②工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年8月上旬
B棟②工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年7月7日(金)
B棟①工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年7月18日(火)

各棟は工区を分けて  
施工します。  
A棟 ①～③工区  
B棟 ①～③工区  
C棟 ①～②工区

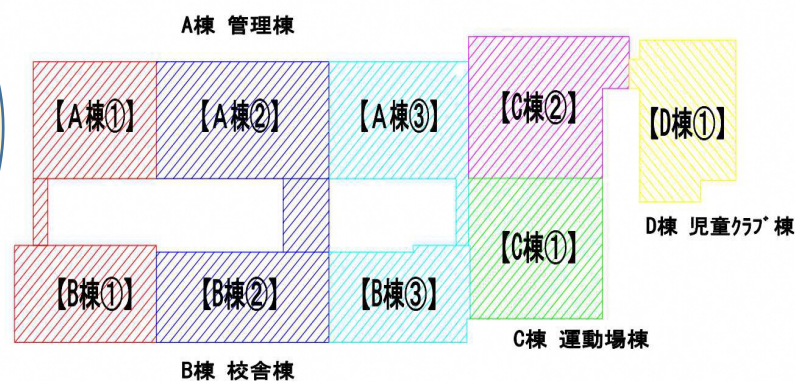

C棟打設状況



C棟 外観



南側 除草作業



A棟躯体工事状況



A棟梁配筋状況



朝のラジオ体操



現場担当の佐藤 圭志です。  
主に、職場の安全管理と書類  
作成を担当しております。  
働く人達が夏の暑さに負けな  
いよう、気軽に水分、塩分補  
給ができる場を設けたり、かき  
水づくり等を行っています。

現在の工事進捗率 34%



施工状況を上空から撮影した写真です。

