

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりお知らせ★

皆様には日頃より「朝陽第五小学校改築工事」につきましてご協力いただき、心より感謝申し上げます。

現在、管理棟（A棟）及び、運動場棟（C棟）は内外装仕上げ工事を行っております。

校舎棟（B棟）は1階躯体工事が完了し、2階、3階躯体のコンクリート打設に向けて、配筋型枠工事を進めております。

児童クラブ棟（D棟）は1階土間工事を進めております。

また、家具や備品等のユニット工事が着工となりました。

本工事及びユニット工事に伴い、工事施工業者が増加することから、これまで以上に現場へ頻繁に大型車両、工事車両が出入りします。


冬期間で道路状況も悪化することから通行には細心の注意を払い、工事を進めてまいります。

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力頂きますようお願い申し上げます。

工事の主な予定

B棟 ②工区	2階躯体コンクリート打設予定日	令和5年12月中旬
B棟 ①工区	2階躯体コンクリート打設予定日	令和5年12月下旬
D棟	1階土間コンクリート打設予定日	令和5年12月中旬

工事現場の年末年始休業予定 令和5年12月31日～令和6年1月4日まで
※休業中は現場職員が巡回等を行うため、場内へ入場します。

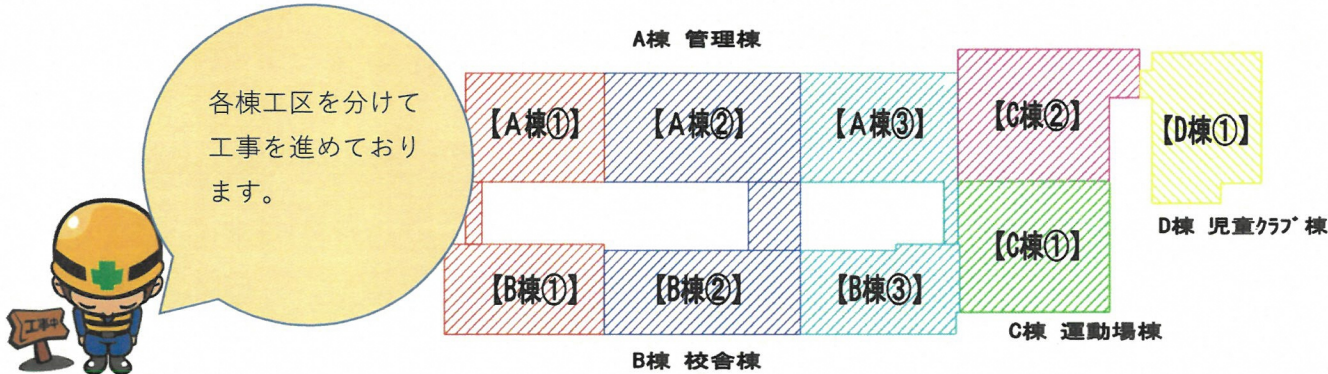

今こんなことをしています。【11月】




C棟屋上防水工事状況



C棟アリーナ天井鉄骨塗装状況



A・B棟躯体工事状況

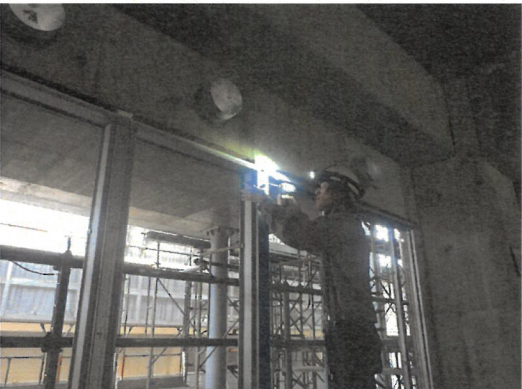

A棟建具取付状況



B棟躯体工事状況



D棟基礎検査状況



朝陽第五小学校ユニット工事
現場代理人の佐藤です。
いち早く現場の雰囲気慣れ、
皆さんとともに無事完成を
迎えられるよう最大限努力します。
よろしくお願いします。

現在の工事進捗率 56.0%



施工状況を上空から撮影した写真です。
