

今こんなことをしています。【12・1月】

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりお知らせ★

皆様には日頃より「朝陽第五小学校改築工事」につきましてご協力いただき、心より感謝申し上げます。

現在、管理棟（A棟）及び、運動場棟（C棟）は内外装仕上げ工事を行っております。

校舎棟（B棟）は最上階の躯体コンクリート打設に向け、配筋型枠工事を進めております。

児童クラブ棟（D棟）は2階躯体コンクリート打設に向けて工事を進めております。


本工事及びユニット工事に伴い、工事施工業者が増加することから、これまで以上に現場へ頻繁に大型車両、工事車両が出入りします。

通勤退勤時に現場周辺が混雑しないよう駐車場を分散させております。

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力頂きますようお願い申し上げます。

工事の主な予定

B棟 ①工区	3階躯体コンクリート打設予定日	令和6年 2月中旬
B棟 ②工区	3階躯体コンクリート打設予定日	令和6年 2月初旬
B棟 南東側外部階段	躯体施工開始	令和6年 2月中旬
D棟	2階躯体コンクリート打設予定日	令和6年 2月中旬

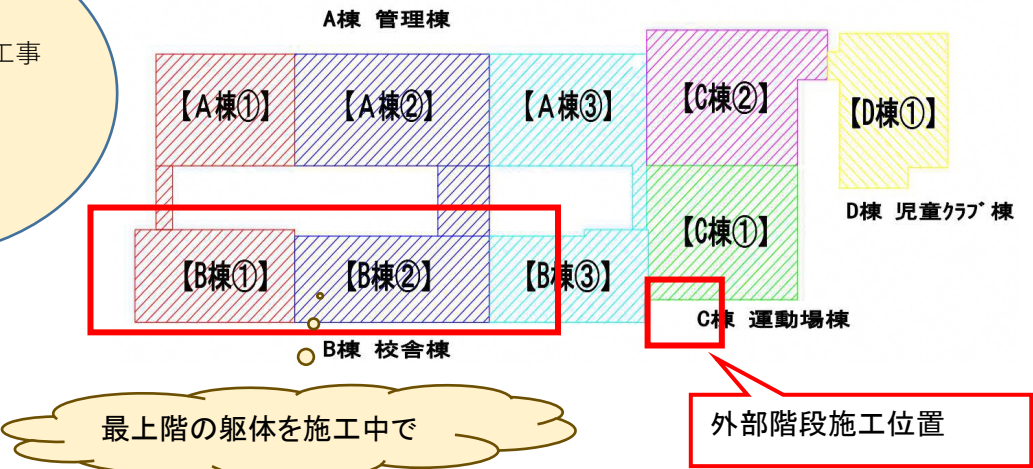

C棟アリーナ壁ボード張り状況



A棟 断熱発泡ウレタン吹付状況



A棟木工事状況



B棟1階 木胴縁受け下地取付




D棟 1階躯体コンクリート打設



緊急時避難訓練

工事機械の紹介

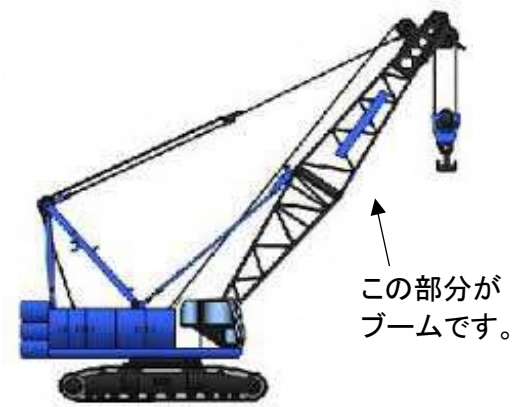

クローラークレーン
高いところや遠いところに物を上げたり、下ろしたりする機械です。ブームが長いので一際目立ちます。

現在の工事進捗率 67.0%



施工状況を上空から撮影した写真です。
