




500

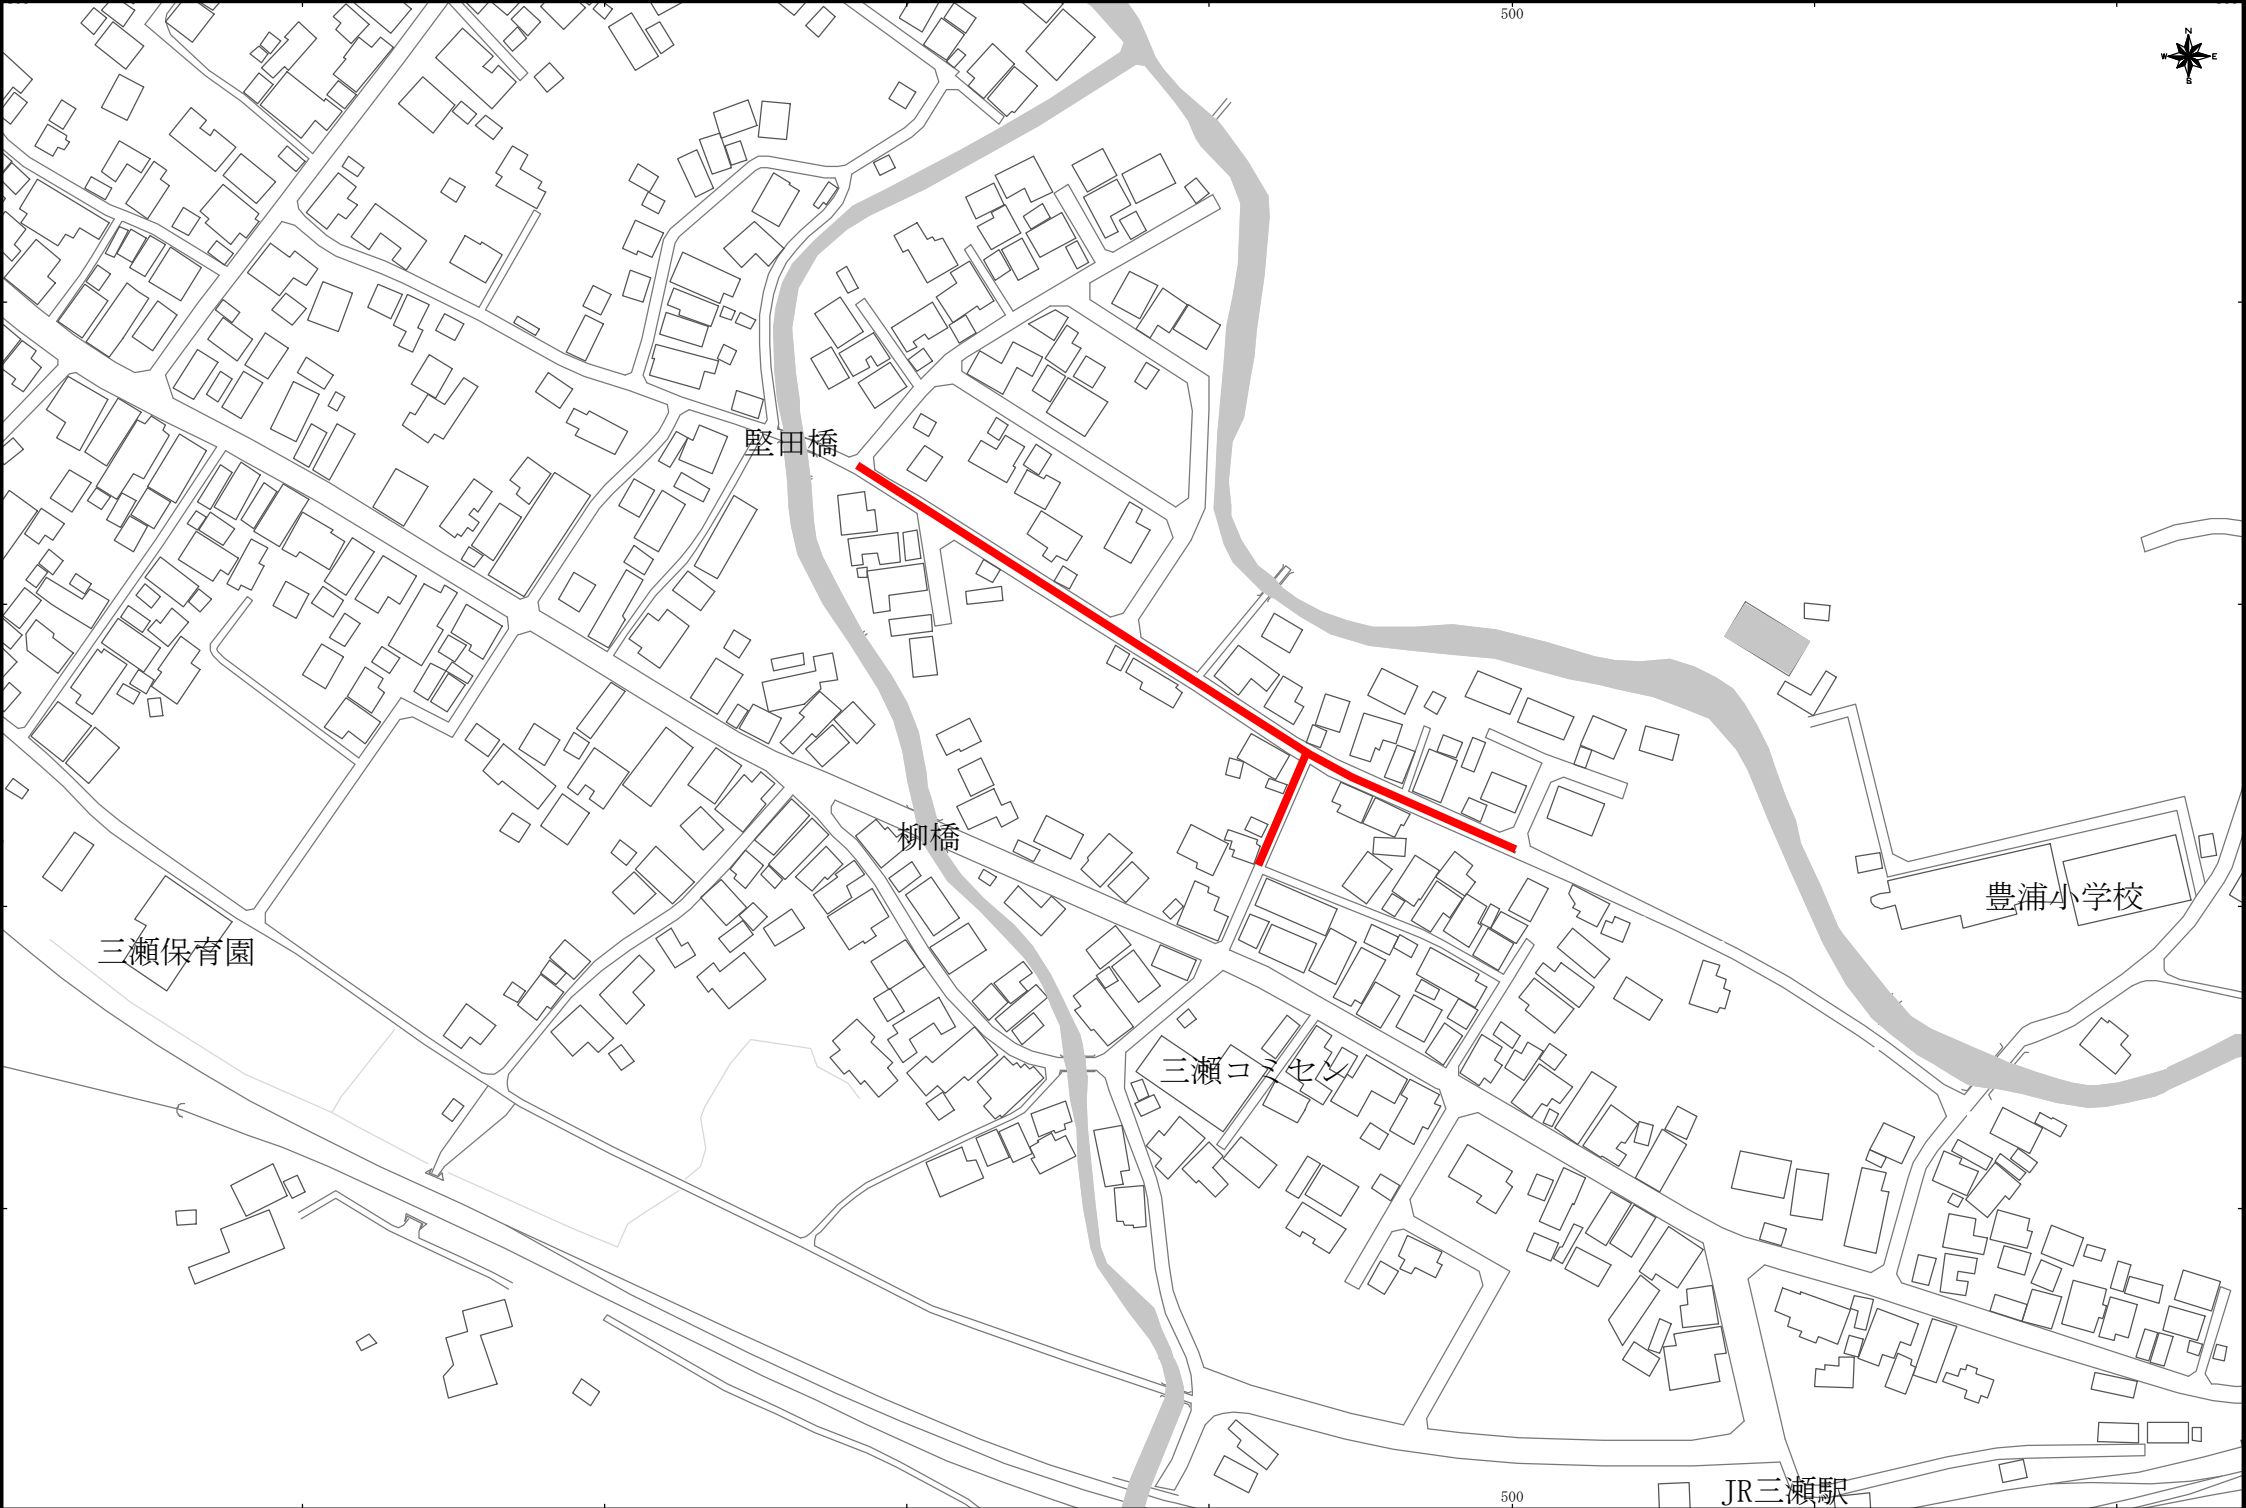

堅田橋

柳橋

豊浦小学校


三瀬保育園

三瀬コニセ

JR三瀬駅

500

S=1/2500



ZMAP-TOWN II 複製利用許諾番号: Z19JB第033号

設 計 概 要	変 更 概 要
(うち補助事業分) 施工延長L=288.6m(288.6m) 管体延長L=284.1m(284.1m) 1. 開削： 自然流下区間 PRP φ 150 施工延長L=288.6m(288.6m) 管体延長L=284.1m(284.1m) 2. マンホール工 組立1号マンホール Φ900 N=5箇所 (5箇所) 3. 取付管およびます工 取付管 VUΦ100 N= 9箇所 (9箇所) L=32.2m (32.2m) 公共汚水ます Φ200塩ビ製 N= 9箇所 (9箇所)	

工 事 番 号	507-2-19	施 工 年 度	令和7年度
工 事 名 称	鶴岡市集落排水事業 三瀬地区管路施設56～67号新設工事		
工 事 場 所	鶴岡市 三瀬 地内		
施 工 主		工事概要 施工延長 L=288.6m 1. 管きょ工（開削） 硬質塩化ビニル管（PRP）φ150 L=284.1m 2. マンホール工 組立1号マンホール N=5箇所 3. 取付管およびます工 取付管 VUφ100 L=32.2m N=9箇所 公共汚水ます（塩ビ製）φ200 N=9箇所	
設 計 区 分			
路 線 名			
工 事 期 間	令和 年 月 日 ～ 令和 8年 3月 23日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	鶴岡市上下水道部下水道課		
積 算 担 当			
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	管路施設					4 週 8 休	労務費 1.04 機械賃料 1.02	場所区分：一般交通影響有り(2)
	管路（補助）							
		管きょ工（開削）		式	1			第 1号内訳書
		マンホール工		式	1			第 2号内訳書
		取付管およびます工		式	1			第 3号内訳書
		付帯工		式	1			第 4号内訳書
		仮設工		式	1			第 5号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		事業損失防止施設費		式	1			第 6号内訳書
		運搬費		式	1			第 7号内訳書
		準備費		式	1			第 8号内訳書
		技術管理費		式	1			第 9号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		共通仮設費		式	1			
		現場環境改善費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 4号		付帯工					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版撤去工				式		1						第 11号明細書	
舗装版仮復旧工				式		1						第 12号明細書	
計													

[illegible]

[illegible]

第 7号		運搬費					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積み上げ運搬費				式		1						第 15号明細書	
計													

第 8号		準備費					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
積み上げ準備費				式		1						第 16号明細書	
計													

[illegible]

[illegible]

第 2号		管布設工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
リブ付硬質塩化ビニル管				式		1						第 4号単価表	
埋設表示				式		1						第 5号単価表	
計													

第 3号		管基礎工					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎				式	1			第 6号単価表
計								

第 4号		管路土留工					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
たて込み簡易土留				式	1			第 7号単価表	
計									
</									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 10号		取付管土留工					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
たて込み簡易土留				式	1			第 17号単価表	
計									

第 11号		舗装版撤去工					1式当たり	明細書				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断				式	1						第 18号単価表	
舗装版破碎				式	1						第 19号単価表	
殻運搬処理				式	1						第 20号単価表	
計												

[illegible]

第 13号		交通管理工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員				式		1						第 24号単価表	
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 9号組立 1 号マンホール							1式当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール設置工	1 号(内径900mm) 3m以下	箇所	4			第 11号単価表		
組立マンホール設置工	1 号(内径900mm) 3m超4m以下	箇所	1			第 12号単価表		
底部工（1 号マンホール）	基礎、床版、インバート	箇所	5			第 13号単価表		
底版（1号マンホール・φ 900）	1号用	個	5					
躯体ブロック（1号マンホール・φ 900）	900×900	個	4					
躯体ブロック（1号マンホール・φ 900）	900×1200	個	1					
直壁（1号マンホール・φ 900）	900×300	個	3					
直壁（1号マンホール・φ 900）	900×600	個	1					
直壁（1号マンホール・φ 900）	900×1200	個	1					
斜壁（1号マンホール・φ 900）	600×900×300	個	3					
斜壁（1号マンホール・φ 900）	600×900×450	個	1					
斜壁（1号マンホール・φ 900）	600×900×600	個	1					
マンホール（φ 900）緊結金具、シール	調整リンクφ 600×50	個	1					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 12号				1式当たり		単価表							
管路埋戻													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
機械投入埋戻工（再生改良土）		バックホウ		m ³	14							第 16号単価表	
人力投入埋戻工（発生土）				m ³	5							第 17号単価表	
計													

第 13号		発生土処理					1式当たり	単価表
名	称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉	m ³	14				
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:19.0km以下						
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉	m ³	6				
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:19.0km以下						
発生土運搬工 (DIDなし)		L=17.7 k m	m ³	2			第 2号単価表	
建設発生土処理費 佐藤建設(株)		コーン指数<800KN/m ² (第3・4種発生土)	m3	14				
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 17号				1式当たり				単価表			
たて込み簡易土留											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下		m	5					第 5号単価表	
引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下		m	5					第 7号単価表	
建込簡易土留 賃料		取付管部		式	1						
計											

[illegible]

[illegible]

第 22号		上層路盤					1式当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
上層路盤（歩道部）		M-40、1層施工 t=80mm		m²	284							
		全仕上り厚:80mm 施工区分:1層施工										
計												

[illegible]

第 24号

1式当たり

單価表

交通誘導警備員

[illegible]

第 25号		事業損失防止施設費					1式当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工損調査		技師C・測量助手（5軒/日）		軒	19			第 20号単価表
計								

[illegible]

第 27号		積み上げ準備費					1式当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
試掘		N2市道部		箇所	6						第 22号単価表	
計												

第 28号				積み上げ技術管理費				1式当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土の一軸圧縮試験		JIS A1216		試料	3				
締固めた土のコーン指数試験				試料	2				
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.05回/m以下		m	284			第 23号単価表	
報告書作成工（本管TVカメラ調査工）		本管、側視回数 0.05回/m以下		m	284			第 24号単価表	
取付け管TV調査工		小型高压洗浄車不要		箇所	9			第 25号単価表	
報告書作成工（取付け管TVカメラ調査工）				箇所	9			第 26号単価表	
計									

令和 7 年度

鶴岡市集落排水事業

三瀬地区管路施設 56～67 号新設工事

下水道工事特記仕様書

【週休 2 日確保工事】

【下水道新設管渠品質確保対象工事】

鶴岡市上下水道部下水道課

1. 共通仕様書の適用

本工事の施工にあたっては、「山形県農林水産部制定共通仕様書（土木工事共通仕様書（令和 6 年 10 月）、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料（令和 6 年 10 月）」、「アスファルト舗装要綱 最新版」、「簡易舗装要綱 最新版」に基づき実施しなければならない。

仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。

なお、令和 7 年 4 月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新の改訂内容についても適用するものとする。

※共通仕様書の一部改訂内容のホームページへは

山形県のホームページ（<https://www.pref.yamagata.jp>）

- 組織別ページ
- 農林水産部
- 農村整備課
- 共通仕様書（土木工事）

2. 共通仕様書に対する特記事項

共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。

第 1 編 共通編

第 1 章 総則

1-1. 工事種別

工事種別は一般土木工事（下水道工事）とする。


1-2. 工期

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項・条件を見込んでいる。

① 準備期間	30 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 夏季休暇期間	3 日間
④ 年末年始休暇期間	6 日間

1－3．週休2日確保工事

1. 本工事は4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「鶴岡市建設工事「週休2日確保工事」実施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
2. 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い、工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
3. 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事実施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
4. 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。
5. 受注者は、週休2日確保工事が完成したときは、施工開始日、施工終了日、対象期間、現場閉所日及び現場閉所率を記載した工事打合簿で実施状況を協議すること。協議にあたっては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
 - （1）振替休日が反映された工程表
 - （2）工事現場の労働者の勤務の状況がわかる出勤簿等の書類

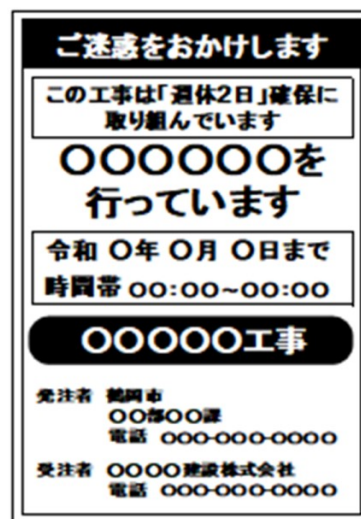

（図）工事標示板への明示の例

~~1－4．余裕期間設定工事について~~

~~1．工期~~

~~本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事開~~

~~始期限日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式「工事開始通知書」により、工事の始期を報告すること。~~

~~余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。~~

~~(一(王 期))
— 工事の始期から — 日
— ただし、令和 年 月 日 (工事開始期限) までに工事を開始すること。 —)~~

~~※ 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。~~

~~2. 主任技術者等の配置~~

~~契約締結日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。~~

~~3. 契約等手続きについて~~

- ~~— (1) — 工事請負契約書に記載する工期は、余裕期間を除いた実工期とし、その他の事項欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。~~
- ~~— (2) — 契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間を含めること。~~
- ~~— (3) — 鶴岡市建設工事請負契約約款第3条の規定に基づく工程表には、実工期の期間を記載すること。~~
- ~~— (4) — コリンズの受注時登録を行う場合においては、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。~~

1－5. 特例監理技術者の配置

- ~~1. — 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。 —~~

- 1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(1)～(8)の要件を全て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、特記仕様書等に示す「監理技術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。

- (1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。

- (2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者（法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者）のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者（1級施工管理技士補）又は1級施工管理技士等の国家資格者1級施工管理技士補又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
- (3) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
- (4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。
- (5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡視及び主要な工程の立会い等の職務を適正に遂行しなければならない。
- (6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
- (7) 監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。
- (8) 兼務する工事が以下の①～④のいずれかに該当しないこと。
 - ① 兼務する2件の工事の予定価格（税込み）の合計が3億円を超える工事
※ ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。
 - ② 発注者が鶴岡市以外の工事
※ なお、鶴岡市発注工事には鶴岡市上下水道事業及び鶴岡市病院事業により発注する工事を含む
 - ③ 総合評価落札方式により発注する工事
 - ④ その他、入札公告等で指定する工事

2. 本工事の監理技術者が特定監理技術者として兼務することとなる場合、前項の(1)～(8)の事項について確認できる書類を提出すること。

3. 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。

1-6. 技術者の専任期間

- 1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との打合せにおいて定める。

2. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で打合せ簿等の書面で明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

1－7. 工事の下請け

受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請けに付する場合は、下請計画（変更）報告書、下請け業者一覧表及び当該工事に係る下請け契約書の写しを提出しなければならない。また、施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。

なお、下請計画（変更）報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。

1－8. 設計変更手続き

設計変更については、入札説明書、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。

1－9. 揚重作業機械について

揚重作業機械は、クレーン車又はクレーン機能付きバックホウを標準とする。やむを得ずその他の機械を使用する場合は、書面により監督職員の承諾を得ること。

1－10. 設計照査に関する事項

設計の照査並びに他の要因により、管渠法線の見直しや工法の再検討が必要になる場合は、設計図書に定められた品質（形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。）確保の観点から技術的な検討を行ったうえで、監督職員と協議を行うこと。

1－11. 施工方法

1. 交通規制

本工事の施工は片側交互通行を基本とするが、狭隘な市道等については通行止めを基本とし、付近住宅等の進入路及び迂回路を確保すること。なお、住宅等への進入路の確保が困難である場合は、仮設駐車場を確保すること。

2. 工事説明（住民への周知）

工事着手前に施工箇所、概要、スケジュール等を記し、地図を添付した「工事のお知らせ」を作成し、監督職員の承諾後に地元町内会長及び沿線住民に配布すること。

また、車両通行止めにて施工を行う場合は、事前に予告看板等を設置し周知を図ると共に、関係機関（幼稚園、保育園、デイサービス等）に通知すること。

3. 交通開放

交通量の多い路線などにおいては路盤状態による開放は行わず、舗装後の開放となるよう工程管理することを原則とする。なお、舗装後の開放が難しい場合は、事前に発注者と協議を行わなければならない。

1-1-2. 境界確認

工事着手前には、土地所有者又は権利者と境界立会いを実施し官民境界を確認することを原則とする。

1-1-3. 建設副産物関係

1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材）は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件を満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン（RC-40）として再資源化している再資源化施設

【アスファルト塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントでなくとも、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可。）

2. 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。なお、搬出完了後、産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

【コンクリート塊】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
	鶴岡市西目字山田森 28-1	小野寺建設(株)	8:00～17:00
	鶴岡市斎藤川原字石川端 77-1	田川砂利工業(株)	8:00～17:00

	鶴岡市勝福寺字根木瀬 158-1	鶴岡建設(株)	8:00～17:00
	鶴岡市大字馬町宮ノ腰 115	(株)三浦土建	8:00～17:00
	鶴岡市藤島字西細杖 262-2	日本海アスコン共同企業体	8:00～17:00
	鶴岡市柳久瀬字武良免 17-7	(株)青木建材	8:00～17:00

【アスファルト塊】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
	鶴岡市勝福寺字根木瀬 158-1	鶴岡建設(株)	8:00～17:00
	鶴岡市大字馬町宮ノ腰 115	(株)三浦土建	8:00～17:00
○	鶴岡市藤島字西細杖 262-2	日本海アスコン共同企業体	8:00～17:00
	鶴岡市柳久瀬字武良免 17-7	(株)青木建材	8:00～17:00

【舗装・コンクリート版切断時に発生する濁水、建設汚泥】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
○	東田川郡庄内町堤興屋字中島 38	(株)安藤組	8:00～17:00

3. 受注者は、資源有効利用促進法第9条の規定により、工事の施工により発生した建設発生土の再生処理の搬出施設を定めなければならない。

【土質改良土】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
○	鶴岡市山田字境興屋	佐藤建設(株)友江プラント	8:00～17:00

4. 受注者は、前2項の条件明示事項と別の方法による場合においては、土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-21（建設副産物）第2項の規定に基づき適正に処理されていることを確認し、発注者に提示しなければならない。

なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。

5. 受注者は、契約締結後、自らの都合により建設工事請負契約約款様式第1号の2（解体工事に要する費用等調書）への記載内容と別の方法等に変更する場合には、あらかじめ監督職員へ説明を行い、承諾を得るものとする。

なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。

また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。

6. 土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-11（建設副産物）第4項に規定する再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）作成のため、「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）及」（EXCEL 様式）は、国土交通省の下記のリサイクルホームページより入手が可。

国土交通省のホームページ（<https://www.mlit.go.jp>）

- 政策情報・分野別一覧
- 総合政策
- 建設リサイクル
- 建設リサイクル報告様式

なお、「建設副産物情報交換システム－COBRIS－」（財日本建設情報総合センターWeb 版入力システム）に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。

7. 工事完成後、「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）」により作成した再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）のデータ（EXCEL 様式）を E-Mail 又は CD により監督職員へ提出すること。

8. 本工事で発生する建設副産物のうち、山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税（山形県産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処理すること。

1-14. デジタル工事写真の小黑板情報電子化

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、契約締結後、監督職員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の第1項から第4項の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者はデジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器、ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、共通仕様書 写真管理基準 2-2 撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、

「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」

(URL:<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)

に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、

「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」

(URL:https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)

を参照とすること。ただし、この使用機器事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真の小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、共通仕様書 写真管理基準 2-2 撮影方法による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、共通仕様書 写真管理基準(デジタル写真管理情報基準)に準ずるが、前項に示す小黑板情報の電子的記入については、写真管理基準 2-4 写真の編集等及びデジタル写真管理情報基準 6.写真編集等で規定されている写真編集には該当しない。

1-15. 社内検査

1. 本工事は、社内検査対象工事とする。

2. 社内検査に従事する者（以下「社内検査員」という。）が検査（完成、一部完成、中間検査、出来高検査をいう。以下同じ。）の事前に契約図書及び関係図書に基づき、品質、出来形、写真管理はもとより工事全般にわたり行い、その結果を所定の様式により提出しなければならない。

3. 社内検査員は、当該工事に従事していない社内の者とする。

4. 社内検査員の資格は、10年以上の現場経験を有し、技術士若しくは1級土木施工管理技士の資格を有する者とする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。

5. 社内検査員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び履歴書を提出しなければならない。社内検査員を変更した場合も同様とする。

なお、社内検査員指定通知書当の様式は品質証明の様式を流用すること。

1-16. 施工管理

1. 主たる工種

- (1) 本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表（出来形測定結果表及び出来形図）及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断できる資料として、工程能力図又は度数表（ヒストグラム）を作成し提出するものとする。なお、受注者が施工管理上必要などの理由により、これ以外のものを作成することを妨げるものではない。

本工事に用いる出来形管理値は、共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）第1編共通工事並びに第8編管水路工事、第4編農道工事によるものとする。また、品質管理は、共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）1. コンクリート関係、2. 土質関係、4. アスファルト関係によるものとする。（なお、国県市道の場合は、2. 土質関係及び4. アスファルト関係の現場密度の施工管理にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書（土木工事共通仕様書（令和7年4月）、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料（令和7年4月）に基づき実施しなければならない。

【主たる工種】

工 種	備 考
管渠工	
人孔工	

- (2) 「主たる工種」については、関連する共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）の出来形管理基準、品質管理基準に定めるある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は、度数表（ヒストグラム）を作成し、提出することを原則とするが、測定数が5点未満の場合については、監督職員と協議し省略することができるものとする。

2. 本工事に用いる規格値は、共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）によるほか、下記によるものとする。

【出来形管理】

工 種	測定項目	規格値	測定基準
マンホール王 (圧入式)	偏心量	100mm 以内	全数についてマンホールの中心 で測定

【品質管理】

工 種	測定項目	規格値	測定基準
-----	------	-----	------

管渠工	埋戻し土の締固め土 (現場密度試験)	締固め度 90%以上	・路体の場合、1,000 m²につき1回の割合で行う。ただし 5,000 m²未満の工事では1工事あたり3回以上。 ・路床の場合、500 m²につき1回の割合で行う。ただし 1,500 m²未満の工事は1工事あたり3回以上。 ※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。
〃	一軸圧縮強度 (一軸圧縮試験)	28日強度 (現場) 50~100kPa	・100mあたり1回以上。 ※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。

1-17. 品質証明

1. 受注者は、施工した管渠の品質を証明するため試験又は調査を実施し、報告書を提出しなければならない。
2. 試験又は調査の方法及び手順、報告書の作成については下記のとおりとする。

管渠種別	試験又は調査の方法	手 順	報告書の作成
自然流下管	本管テレビカメラ調査	鶴岡市下水道道新管テレビカメラ調査要領による	同左 別紙添付
取付管	取付管カメラ調査	同上	同左
圧送管	水密試験	鶴岡市下水道圧送管調査手順書による	同左 別紙添付

1-18. 履行報告

受注者は、請負代金が1,000万円以上となる工事においては、毎月の履行状況を工事履行報告書(様式第10号の3)により翌月初めまで監督職員に提出しなければならない。なお、予定工程に対して10%以上遅延している場合は、フォローアップを実施し、その実施方法に関して書面において提出すること。(施工パーティー1班追加等。)

1-19. 前金払い・中間前金払い

1. ~~本工事は債務負担行為によるものから、前金払い請求を行う場合は、令和○年4月1日以降に請求すること。~~

2. 契約約款36条第3項に基づき中間前金払いを請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払い認定請求書（様式第10号の2）に監督職員の確認を受けた直近の履行報告書（様式第10号の3）の写しのほか必要な書類等を添えて提出するものとする。

1-20. 工事名表示板に関する事項（安全確保関係）

1. 工事名表示板に記載する工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。

工事の種類	下水道工事中。
工事内容の説明	道路に下水道管を埋設しています。

2. 本工事は道路上における工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は契約上の期間とし、これとは別に、適宜交通上支障を与える期間をしめした表示により周知を図るものとする。

1-21. 石綿障害予防規則第9条に関する事項（安全確保関係）

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ装置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議のうえ、設計変更で見込むものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。

1-22. 施工方法、時間の制限に関する事項（環境対策関係）

本工事の施工に使用する建設機械は、排出対策型によるものとする。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

1-23. 事業損失に関する事項（環境対策関係）

1. 家屋等の工損等調査

(1) 別に定める「補償事務の手引き」に基づき、沿道（周辺を含む）家屋等の事前調査、事後調査を実施し、市様式「工損事前事後調査調書」により報告すること。

(2) 被害が発生した場合、その被害全部について調査を前項に準じて行うこと。

(3) 前項の被害調査結果を発注者に報告し、補償事務の公平と統一を確保するため協議すること。

2. 家屋等の応急措置

第三者の家屋に与えた被害が日常生活、又は営業上著しい支障を生じる場合は応急措置を講じ、その内容を監督職員に報告すること。

3. 家屋等の被害補償

(1) 受注者の施工上の原因により発生した家屋被害については、受注者は被害者と協議し合意に達した工法又は方法で補償すること。基本は金銭補償とする。

(2) (2) 1 項により難い場合は、「家屋工作物被害発生状況調書」により監督職員に要請すること。

4. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

5. 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-24. 交通安全に関する事項（交通安全管理関係）

1. 交通誘導員の配置

交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付せられた場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2. 歩行者用の仮設道路が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3. 車両乗入れ部等の工事の際に覆工等が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4. 施工に伴い段差擦り付けが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-25. 施工時期、時間、施工方法の制限事項（工程関係）

1. 本工事の施工は、常時 1 班体制による設計積算及び計画している。なお、これにより施工計画を策定し実施しなければならない。

受注者の作業計画において複数班体制により実施したい場合は、監督職員と協

議しなければならない。

2. 本工事において、他の管理者より施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3. 本工事の作業時間帯は下表のとおりとする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は、作業時間帯に関して速やかに監督職員と協議しなければならない。

工種又は種別・細別	時 間 帯		期 間
	作業開始	作業終了	
全工種	8時30分	17時00分	

4. 受注者は、中断期間内は現場内巡視点検を行い、安全の確保に努めなければならない。

1-26. 工事支障物件に関する事項（工程関係）

1. 地下埋設物・架空線等

- (1) 現況測量時に周囲の状況を確認し、埋設物（水道、電力、NTT、ガス）に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。

なお、上空に特別高圧（7,000V以上）がある箇所においては、着工前に必ず東北電力ネットワーク(株)山形支社（山形市本町二丁目1番9号）へ施工協議を行い、その結果を監督職員に報告すること。

- (2) マンホール箇所毎に試掘を行い、地下埋設物の種類、位置等を調査し、下水道管布設箇所との離隔を図面及び写真等により監督職員に報告すること。

また、試掘の結果、地下埋設物が施工に支障となる場合、監督職員より支障物の管理者へ移設を依頼し、埋設物管理者の支障物件移設工事完了後、下水道管布設工事に着手すること。

試掘に関わる費用は、共通仮設費（準備費）において1箇所あたり（A=1.0 m²、H=1.2m程度）として計上しており、数量の軽微な増減による変更は行わない。なお、現場状況によりこれにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

1-27. 他工事との関連事項（工程関係）

1. 本工事の施工に際して、別途発注予定の工事と工程及び交通規制の調整を図ること。

・鶴岡市集落排水事業 三瀬地区管路施設 81-1～90-3 号新設工事（三瀬地内）

1－28．災害時の協力体制

1．緊急巡視

- (1) 緊急巡視とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合、又はその恐れがある場合にその状況を把握し適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。
- (2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講じるとともに、その状況について監督職員に報告するものとする。
- (3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影により日時及びその状況を記録しておくものとする。
- (4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。

2．災害時の協力体制と緊急時の諸作業

工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立しなければならない。

3．緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。

4．工事現場のほか、下水道施設が被災した際は、復旧に向けて協力するものとする。

1－29．事故報告

1．受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに建設工事労働災害事故報告書（共通仕様書（参考資料）参考様式5）をFAX、又はE-Mailにより提出しなければならない。

2．報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わずすべて報告すること。

3．建設工事労働災害事故報告の様式は、以下のホームページに掲載している。

山形県のホームページ（<http://www.pref.yamagata.jp>）

- 県政情報
- 山形県の紹介
- 組織案内
- 県土整備部

- 建設企画課
- 共通仕様書（土木工事）

1-30. 労働者確保に関する積算方法の試行工事

本工事は、労働者確保に関する積算方法の試行工事の対象とする。

1. 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の次に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書（山形県県土整備部）による積算金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する。

営繕費：労働者送迎費宿泊費、借上費

（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用。

2. 本工事の予定価格の算出基礎とした設計額（土木工事標準積算基準書に基づき算出した額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。
 - （1） 共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：9.45%
 - （2） 現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：1.26%
3. 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費にかかる費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式1）」及び実績変更対象間接費について実際に支払ったすべての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適正性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
5. 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、すべての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。
7. 受注者は、実績対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

1－3 1. 建設現場における遠隔臨場

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)(山形県県土整備部)の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場の適用

現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用、不適用については、受発注者間にて協議のうえ、適用を選定することができる。受注者は適用する工種、確認項目に関する協議資料作成にあたり、「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)」別表 1～3 を参考とする。

3. 実施内容

(1) 段階確認、材料確認及び立会での確認

受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声を、Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」及び「立会」を行うものである。なお、ウェアラブルカメラ等の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報国寺島でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)や Web 会議システム等は受注者が手配、配置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し、決定するものとする。下表に動画撮影用カメラ、Web 会議システム等に関する参考数値及び発注者の標準的な通信環境の仕様を参考に示す。

【動画撮影用のカメラに関する仕様】

項目	使用	備考
映像	画素数:640×480 以上	カラー

	フレームレート:15fps 以上	
音声	マイク:モノラル(1 チャンネル)以上	
	スピーカー:モノラル(1 チャンネル)以上	

【Web 会議システムに関する仕様】

項目	使用	備考
通信回線速度	下り最大 500Mbps、上り最大 5Mbps	
映像・音声	転送レート(VBR):平均 1Mbps 以上	

【画質・画素数と最低限必要な通信速度】

画質	画素数	最低限必要な通信速度
360p	640×480	530kbps
480p	720×480	800kbps
720p	1280×1080	1.8Mbps
1080p	1920×1080	3.0Mbps
2160p	4096×2160	20.0Mbps

※ 使用する機器の機能としては使用を満たしていても、機器の設定により、仕様を満たさない場合があるため、注意すること。(例:使用する端末の画質を「高設定」にした場合は使用を満たすが、「低設定」にした場合、仕様を満たさないことがあるため、端末画質を「高設定」にすること。)

【発注者の標準的な通信環境の仕様】

項目		仕様
通信プロトコル方式及び ポート番号	TCP	80、443
	UDP	なし
利用環境	OS	Windows10
	ブラウザ	Microsoft Edge、Google Chrome
	アプリケーション	ZOOM、Teams、Goolge Meet

(3) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(4) 費用

遠隔臨場に係る費用については、技術管理費に積上げ計上する。なお、詳細については、最新の遠隔臨場に関する事務連絡等を参照すること。

1-3-2. 不可抗力による損害に関する事項

本工事における天災等は、共通仕様書第1編第1章総則1-1-45（不可抗力による損害）第2項の各号に掲げる基準を超えるものとする。

1-3-3. 工事現場の現場環境改善費

1. 本工事は、工事の現場環境改善費を計上する工事である。

この現場環境改善とは、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ工事関係者の意識を高め、現場労働者の作業環境改善を行うものであり、受注者は、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事の円滑な執行を実施しなければならない。

2. 現場環境改善を行う内容は、・・・

●現場環境改善を行う内容は、下記の4計上費目ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の計5つの内容を選定のうえ、実施するものとする。

●現場環境改善を行う内容は、○○関係について○○○を実施するものとするほか、下記の4計上費目ごとに1内容ずつの計5つの内容を選定のうえ、実施するものとする。

計上費目	実施する内容（率計上分）
現場環境改善 （仮設備関係）	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇、3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置、5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減
現場環境改善 （営繕関係）	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化、3. デザインボックス（交通誘導員待機室） 4. 現場休憩所の快適化、5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 （安全関係）	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等）、3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む）、9. 社会貢献

3. 受注者は、具体的な実施内容と実施時期を事前に監督職員と協議し、その結果を報

告すること。

4. 以下の項目については、現場環境改善の内容に含まれないことから、実施にあたっては留意すること。

- (1) 仮設関係：仮囲い、模様フェンス、仮歩道マット
- (2) 営繕関係：デザインボックス、倉庫及び材料保管庫、監督員詰所、シャワー施設、ウォータークーラー、観葉植物、意見箱の設置
- (3) 安全関係：バリケード、転落防止柵

1-34. 公共污水マス設置位置及び深さ

1. 公共污水マス調査責任者を専任し、隣接地権者全てより「公共污水マス設置確認書」及び「公共污水マス不要に係る確認事項」を回収し監督職員へ提出すること。
2. 公共污水マス調査責任者は、公共污水マス設置個所及び深さが想定される宅内排水設備の基準（土被り及び管勾配等）を満足できるか確認しなければならない。
3. 宅内排水設備より公共污水マスの深さが90cm以下となる場合であっても、90cm以下としないこと。（公共污水マス最小深さ90cm（標準）とする。）
なお、本管の埋設位置や宅地状況等により公共污水マスの深さが90cm以下となる場合については、監督職員と協議しなければならない。

1-35. 提出書類

1. 下請負を締結する場合は、下請等（計画・変更・結果）報告書及び施工体系図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、下請等報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中断もあり得る。
2. 工事の完成後に提出する書類の他に、下記の工事竣工図書等を提出すること。
 - ・ 竣工図書（下水道台帳基礎データ表、竣工図 S=1：500、詳細図）
※竣工図書の作成については、別に定める「鶴岡市下水道工事竣工調書作成マニュアルー2020年度版ー（令和2年6月1日以降適用）」によるものとする。
なお、下水道台帳基礎データ表は EXCEL 形式による調書とし、データファイルは別に提供する。

1-36. ウィークリースタンス等の推進

本工事は、受発注者協力のもと、工事の円滑化と品質の向上を図るとともに、働き方改革を推進し、担い手確保に努めること目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めて

いくこととする。

1. 打合せ時間の配慮

受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後4時以降の打合せは行わない。

2. 作業依頼の配慮

- 1) 作業内容に見合った作業期間を確保する。
- 2) 休前日(金曜日など)に休日明け日(月曜日など)が期限日の依頼をしない。
- 3) 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。

3. ワンデーレスポンスの再徹底

- 1) 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。

4. 留意事項

- 1) 緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができない場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を図る。
- 2) 設計変更を伴う作業依頼については、「設計変更ガイドライン」に基づき適正に対応する。

~~1-37. 施王箇所が点在する工事の間接費の積算について~~

- ~~1. 本工事は、施王箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施王実態に乖離が考えられるため、『①：〇〇王区(施王箇所：〇〇地内)』、『②：〇〇王区(施王箇所：〇〇地内)』ごとに共通仮設費及び現場管理を算出する「施王箇所が点在する工事の積算方法の試行工事である。」~~

- ~~2. 本工事における共通仮設費の金額は、対象王区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象王区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。~~

~~なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(施王区域、施王時期等)については、対象王区ごとに設定する。~~

1-38. 情報共有システム利用の試行対象工事

1. 本工事は、情報共有システムを利用する試行の対象工事であり、情報共有システムを利用することを原則とする。ただし、契約締結後に受注者が監督職員と協議し、通信回線を確保出来ない等の理由により利用することが困難と判断した場合は、この限りでない。
2. 使用する工事情報共有システムは、LGWAN 環境で使用できるものを選定し、監督員の承諾を得たうえで決定すること。

3. 情報共有システムの利用に関する費用については、共通仮設費の率分に含まれる。
また、登録料及び利用料については、受注者が支払うものとする。
4. 情報共有システムの利用については、「鶴岡市情報共有システム利用試行要領」に基づき実施すること。
5. これらに定められていない事項は、監督職員と協議するものとする。
6. 機能要件は、国土交通省が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」及び「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件」とする。

※国土交通省ホームページ参照 (http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_rev20/)

1－39. その他

1. 工期は書類作成や境界立会い、調査、変更手続き、手直し等を含み検査の準備に要する日数を含むものであり、契約工期の2週間前に現場を完了するように工程管理すること。
2. 工事費の増減を伴う変更が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。なお、協議を行わずに変更したものについては変更の対象とはしない。
3. 当該工事期間中に建設業退職金共済組合の証紙を追加購入した場合は、速やかに追加分の建設業退職金共済組合掛金収納書届を提出すること。

2章 土工

2－1. 建設発生土の埋戻し利用

本工事の埋戻しに使用する土砂は、「発生土利用基準について」（平成18年8月10日付け国官技第112号・国官総第309号・国営計第59号）に基づき建設発生土の適正な再生利用を図るものとする。なお、本工事の建設発生土を利用する場合は、仮置場までの建設発生土の運搬及び埋戻し箇所までの運搬は本工事に対応するものとする。

ただし、土質調査等の結果により利用困難と認められた時は、設計図書に関し監督職員と協議しなければならない。

【土質試験】

判定指標	規 格	規格値	測定頻度
------	-----	-----	------

コーン指数	JIS A 1228	コーン指数 800KN/m ² 以上	管路埋戻土量 200 m ³ につき 1 回の割合で行う。
-------	------------	----------------------------------	--

2－2．建設発生土受入れ地

1. 本工事における建設発生土の受入先は、
受入先は新産業団地開発工事造成地とし、当該工事受注者が集積するため、建設発生土の搬出時期など調整を行うこと。運搬距離は17.7kmで計上している。ただし、受入先が定める所定の基準に適合すれば搬出可能となるが、不適合の場合には、本工事における受入先を改めて監督職員が指示する。
2. 本発注仕様での受入れ条件に変更がある場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。

2－3．埋戻しの施工管理

1. 埋戻しについて

- (1) 埋戻しの転圧は、規定の厚さ以下で規定の締固め密度を満足すること。
- (2) 建込簡易土留めを設置した場合は、埋戻し1層毎に建込簡易土留めを引抜き、引抜き箇所を含めて入念な締固めを行い、規定の締固め密度を満足すること。

2. 埋戻し不良について

規定の埋戻しがされていないことが判明した場合や、建込簡易土留めの1層毎の引抜きがなされていない場合は、規定の施工がされていると判断できる資料がある区間以外については原則全て再転圧施工すること。

3. 鋼矢板の引抜き

- (1) 鋼矢板（軽量鋼矢板を含む。）を引抜く場合は、地中に空隙が生じないように、引抜きと同時に砂やセメントミルクで空隙を充填すること。
- (2) 空隙の充填を行わず地盤変動等が生じた場合は、施工者の責任において補修を行うこと。

第2編 材料編

第1章 一般事項

1-1. 指定材料の確認

受注者は、下記の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。

区 分	確認材料名	摘 要
(その他)	(発注者が指示するもの)	

1-2. 工事材料の確認

市が一括承認済みの骨材、二次製品等については、承認資料等の提出を省略できる。なお、使用材料は、納入された時に必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は返却等の処置を施すこと。確認時に不良品を発見した場合、手直し指示する場合がある。(例えば、二次製品、路盤材料の入替え。)

第2章 土木工事材料

2-1. 再生資材の使用

工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。

材料名	規 格	使用箇所	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	基礎碎石 下層路盤 歩道路盤	
再生アスファルト合材	密粒度 As13 細粒度 As13	表層	仮舗装
再生改良土	修正 CBR12%以上	土工	埋戻し財 ※品質試験として 土の締固め試験 JIS A 1210 を行うこと

1. 再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を破砕、選別混合物除去、粒度調整等を行うことにより再生資源化された資材をいい、これら以外の材料（新材の砕石又はズリ等）が混合されていない状態のものをいう。
 2. 下層路盤材、歩道路盤材に使用する再生砕石（RC-40）は、下記の品質基準を満足するものとする。
 - ・ 修正 CBR
下層路盤材 修正 CBR 40 % 以上
歩道路盤材 修正 CBR 20 % 以上
 - ・ 粒度範囲
骨材のふるい分け試験方法 JIS A 1102 により、粒度が土木工事共通仕様書第 2 編材料編 2-3-3 表 2-4 に適合すること。
 - ・ 塑性指数（下層路盤の場合のみ）
土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 により、塑性指数 P I が 6 以下であること。
 - ・ すりへり減量
粗骨材のすりへり減量試験 JIS A 1121 により、すりへり量が 50 % 以下であること。
 - ・ アスファルト塊混入率
再生骨材に含まれるアスファルト塊が 70 % 以下であること。
- 2-2. 購入土
- 購入土は、CBR 12 % 以上とし監督職員の承諾を得なければならない。
- 2-3. 生コンクリート
- 工事に使用する生コンクリートは、高炉セメント（B 種）を標準とする。
- 2-4. 山形県リサイクル認定製品
- 土木工事共通特記仕様書第 1 編共通編 1-1-12 リサイクル認定製品に規定する「山形県リサイクル認定製品」は、山形県の環境エネルギー部循環型社会推進課のホームページにより確認することができる。
- <https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/kankyo/recycle/recyclesystem/index.html>
- 2-5. 下水道用リサイクル製品

下水道用リサイクル製品は、硬質塩化ビニル製柵・継手があり、積極的な使用に努めることとする。なお、製品の詳細については、監督職員からの聞き取りのほか、下記記載の塩化ビニル管・継手協会のホームページにより確認することができる。

(<http://ppfa.gr.jp>)

2－6．セメントコンクリート製品

J I S 製品及び山形県コンクリート製品工業組合で一括承認を受けた製品以外の材料については、監督職員に使用承諾を提出し材料確認の立会いを行うこと。

2－7．遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の試行工事

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名	規 格	調達地域等
碎石	R C－4 0	庄内地区
碎石	M－4 0	庄内地区
砂	丘砂	庄内地区

3 編 土木工事共通編

第 1 章 総則

1－1．段階確認

共通仕様書第 3 編土木工事編 1－1－2 監督職員による確認及び立会い等により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表 1 に、次の工種を追加するものとする。

種 別	細 別	確認時期	確認項目
管路土工	路床確認	下層路盤施工前	幅・厚さ 密度・高さ
管きょ工	曲管等	布設完了時	延長（3 点）

	オフセット確認	(随 時)	基準高
管きょ工	圧送管水圧試験 —(水圧試験)—	布設完了時 —(随時)—	鶴岡市下水道圧送管 調査手順書による
舗装工	路盤 下層路盤 上層路盤	表層施工前	幅・厚さ 密度・高さ
その他	監督職員が 指示するもの	(随 時)	

1－2．工事中の安全確保

土木工事にあつては、共通仕様書第1編1－1－3 1（施工管理）の規定に加え、以下の規定によらなければならない。

請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達 平成5年1月12日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。なお、詳細については監督職員と協議を行うこと。また、受注者は鶴岡警察署に申請する道路使用許可書の道路使用許可条件に従い施工すること。

第2章 一般施工

2－1．仮設備

開削工法の仮設工（管路土留）の構造は建込簡易土留め及び軽量鋼矢板土留を標準とするが、これにより難しい場合は監督職員と協議すること。

2－2．湧水処理に関する事項

- 1． 水替えが必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
- 2． 水替えは、土留め施工箇所は常時排水、素掘り箇所は作業時排水とする。

2－3．六価クロム溶出試験

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土埋戻しを行う場合は、受注者は改良土搬出業者による六価クロム溶出試験の実施を再確認し、試験結果を随時提出するものとする。

2－4．舗装切断

舗装切断方法については、斜め切りカッターを標準とするが、監督職員と協議すること。

2-5. 湧水処理

1. 舗装版切断時に発生する濁水等については、排水吸引機能を有する切断機等により回収し、周囲に流出しないよう適正に処理を行わなければならない。なお、処分費等の必要が生じた場合には、その処理方法等について協議するものとする。
2. 「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者（受注者）は、その責任において、適正な処理のために必要な産業廃棄物情報（成分や性状等）を把握し、処理業者に提供することが必要である。

2-6. 舗装工・マンホール工

舗装仕上がり面は現況を基本とするので、事前測量を徹底しマンホール高さを決定すること。（舗装仕上がり面に対してマンホール天端や既施設（止水弁等）を合わせなければならない。）なお、現況舗装面がかまぼこ状などにより見直しが必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

2-7. 瀝青材料の散布

1. プライムコートの使用量は $1.2 \ell / \text{m}^2$ を標準とする。
2. タックコートの使用量は $0.4 \ell / \text{m}^2$ を標準とする。

~~2-8. 既設管改良工~~

~~1. コンクリートの使用に関する事項~~

~~「下水道施設における土木コンクリート構造物の設計について」について、国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課企画専門官より平成13年8月23日付け事務連絡に伴い、本工事においてマンホールのインバート部については18N以上とする。~~

~~2. 特記事項~~

~~→現場工事~~

~~撤去現場作業において、既設部分に必要な加工及び工事が発生する場合は、事前に承認を得ること。~~

~~既設管をやむなく存地する場合は、管内部をモルタルで充填するなど、土砂流入させないように施工すること。~~

~~2-9. マンホール蓋交換工~~

~~1. マンホール蓋（受枠）と躯体との調整方法~~

~~マンホール蓋（受枠）と躯体との調整について、調整リング及び無収縮モルタルによる調整を標準とする。~~

2-10. 新管テレビカメラ調査

新管テレビカメラ調査は、「鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領」に基づき工期内に実施し、品質証明（社内検査）で社内評価すること。その後、監督職員による確認を実施する。その結果により、万が一手直しが発生した場合、工期内に実施すること。竣工検査は是正確認後に実施する。そのため、工程に余裕を持ちカメラ調査を実施すること。

2-11. 設計及び施工マニュアル

鶴岡市上下水道部下水道課が発注する管路新設工事に係る設計及び施工に関する統一的な解釈及び運用、その他必要事項について、「鶴岡市下水道設計マニュアル」及び「鶴岡市下水道施工マニュアル」にて定めており、これに基づき実施するものとする。

なお、設計及び施工マニュアルは以下のホームページに掲載されている。

鶴岡市のホームページ（<https://www.city.tsuruoka.lg.jp>）

→ 暮らし

→ 下水道（下水道に関するお知らせ、使用料・負担金・各種手続きガイド、下水道関連情報）

→ 鶴岡市下水道設計・施工マニュアルについて

令和 7 年度

鶴岡市集落排水事業
三瀬地区管路施設56～67号新設工事

数量総括表・数量計算書(補助)

鶴岡市 三瀬 地内

当初：黒字
変更：赤字

工事区分	工程	種別	細別	規格	単位	数量	計算式	摘要
管路（補助）								
	管きょ工（開削）							
		管路土工						
			管路掘削	掘削 BH0. 28m3	m3	247	246. 8 = 246. 8	土工集計表・計算書
				機械掘削工 BH0. 28m3	m3	219	219. 1 = 219. 1	土工集計表・計算書
			管路埋戻	機械投入埋戻工 管保護部 BH0. 28m3 再生改良土	m3	63	62. 9 = 62. 9	土工集計表・計算書
				機械投入埋戻工 埋戻部 BH0. 28m3 再生改良土	m3	288	287. 9 = 287. 9	土工集計表・計算書
			発生土処理	土砂等運搬 4tDT L=13. 2km 現場～改良センター	m3	247	246. 8 = 246. 8	
				発生土運搬工 4 t DT L=13. 2km 現場～改良センター	m3	104	350. 8-246. 8 = 104. 0	
				発生土運搬工 4 t DT L=17. 7km 現場～新産業団地	m3	115	219. 1-104 = 115. 1	
				建設発生土処理 水分50. 0未満	m3	351	62. 9+287. 9 = 350. 8	
		管布設工						
			リブ付硬質塩化ビニル管	リブ付硬質塩化ビニル管布設工 PRP φ 150	m	284	284. 1 = 284. 1	管きょ数量表
				(材料) リブバンド PRP φ 150 5°	個	1	1. 0 = 1. 0	管曲管・伏越VU150調書
			埋設表示	下水道用埋設表示シート 2倍 150mm×50m	m	284	284. 0 = 284. 0	管きょ数量表
				埋設表示テープ B30mm×t0. 15mm±0. 03mm	m	361	361. 0 = 361. 0	管きょ数量表
		管基礎工						
			砕石基礎	砕石基礎設置 機械施工 RC-40 t=15cm	m3	38	38. 4 = 38. 4	土工集計表・計算書

数量総括表

当初：黒字
変更：赤字

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計算式	摘要
				(材料)砕石 RC-40	m3	46	38.4*1.2 = 46.1	土工集計表・計算書
		管路土留工						
			建込簡易土留	建込工 掘削深2.0m以下	m	179	178.7 = 178.7	工程算出表
				建込工 掘削深2.5m以下	m	110	110.0 = 110.0	工程算出表
				引抜工 掘削深2.0m以下	m	179	178.7 = 178.7	工程算出表
				引抜工 掘削深2.5m以下	m	110	110.0 = 110.0	工程算出表
				建込簡易土留 賃料	式	1	1.0 = 1.0	建込簡易土留賃料算出表
		開削水替工						
			開削水替	ポンプ運転 口径50mm 商用電源 常時排水	式	1	1.0 = 1.0	水替日数数量計算書
				ポンプ設置・撤去	式	1	1.0 = 1.0	
	マンホール工							
		組立マンホール						
			1号マンホール	組立マンホール工(基礎材含) 1号 マンホール深3m以下	箇所	4	4.0 = 4.0	1号マンホール数量計算書
				組立マンホール工(基礎材含) 1号 マンホール深3m以上4m以下	箇所	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				底部工 1号	箇所	5	5.0 = 5.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 底版	個	5	5.0 = 5.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 躯体 900×900mm	個	4	4.0 = 4.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 躯体 900×1200mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書

数量総括表

当初：黒字
変更：赤字

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計算式	摘要
				(材料費)1号マンホール 直壁 900×300mm	個	3	3.0 = 3.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 直壁 900×600mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 直壁 900×1200mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 斜壁 600×900×300mm	個	3	3.0 = 3.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 斜壁 600×900×450mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)1号マンホール 斜壁 600×900×600mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)調整リング 600×50mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)調整リング 600×100mm	個	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)調整リング 600×150mm	個	3	3.0 = 3.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)マンホール調整金具 調整高25mmまで	組	4	4.0 = 4.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)マンホール調整金具 調整高45mmまで	組	3	3.0 = 3.0	1号マンホール数量計算書
				(材料費)鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-14 マーク入り 浮上防止 かぎ付	組	5	5.0 = 5.0	1号マンホール数量計算書
				マンホール削孔 φ150	箇所	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
				マンホール用可とう管 φ150	箇所	1	1.0 = 1.0	1号マンホール数量計算書
			内副管	内副管取付工 H≤1.0	箇所	1	1.0 = 1.0	副管設置工数量計算書
				内副管取付工 1.0<H≤1.5	箇所	1	1.0 = 1.0	副管設置工数量計算書
				(材料費)スリム内副管立管 4m/本 VUφ100	本	0.3	0.3 = 0.3	副管設置工数量計算書
				(材料費)スリム内副管継手 VUφ150-100	個	2	2.0 = 2.0	副管設置工数量計算書

数量総括表

当初：黒字
変更：赤字

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計算式	摘要
				(材料費)スリム内副管用固定バンド VUφ100	個	2	2.0 = 2.0	副管設置工数量計算書
				(材料費)スリム内副管用エルボ VUφ100	個	2	2.0 = 2.0	副管設置工数量計算書
	取付管およびます工							
		管路土工						
			管路掘削	掘削 BH0.28m3	m3	20	17+2.9 = 19.9	土工集計表・計算書
				機械掘削工 BH0.28m3	m3	2	1.8 = 1.8	土工集計表・計算書
				掘削 人力	m3	5	4.2+0.8 = 5.0	土工集計表・計算書
			管路埋戻	機械投入埋戻工 BH0.28m3 再生改良土	m3	14	9.8+3.7 = 13.5	土工集計表・計算書
				埋戻し 人力 流用土	m3	5	3.8+0.8 = 4.6	土工集計表・計算書
			発生土処理	土砂等運搬 4tDT L=13.2km 現場～改良センター	m3	14	13.5 = 13.5	
				土砂等運搬 4tDT L=17.7km 現場～新産業団地	m3	6	19.9-13.5 = 6.4	
				発生土運搬工 4tDT L=17.7km 現場～新産業団地	m3	2	1.8 = 1.8	
				建設発生土処理 水分50.0%未満	m3	14	13.5 = 13.5	
		ます設置工						
			ます	ます設置工(基礎材含) VUφ200	箇所	9	8+1 = 9.0	土工集計表・計算書
		取付管布設工						
			取付管	取付管布設工(基礎材含) VUφ100 3m以上5m未満	箇所	9	8+1 = 9.0	土工集計表・計算書
			埋設表示	下水道用埋設表示シート 2倍 150mm×50m	m	32	27.6+4.6 = 32.2	土工集計表・計算書

数量総括表

当初：黒字
変更：赤字

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計算式	摘要
				埋設表示テープ B30mm×t0.15mm±0.03mm	m	41	35.4+5.7 = 41.1	土工集計表・計算書
		管路土留工						
			取付管土留工	建込工 掘削深2.0m以下	m	5	4.6 = 4.6	工程算出表
				引抜工 掘削深2.0m以下	m	5	4.6 = 4.6	工程算出表
				建込簡易土留 貫料	式	1	1.0 = 1.0	建込簡易土留貫料算出表
	付帯工(開削)							
		舗装撤去工						
			舗装版切断	舗装版切断 As 15cm以下	m	624	577.2+40+7.2 = 624	土工集計表・計算書
			舗装版破碎	舗装版破碎 As 15cm以下	m2	286	259.7+23.6+3.1 = 286	土工集計表・計算書
			殻運搬処理	殻運搬・処理 As L=28.2km 現場～日本海アスコン	m3	14	13+1.2+0.2 = 14	土工集計表・計算書
		舗装仮復旧工						
			下層路盤	RC-40 t=20cm	m2	282	258+20.9+3.1 = 282.0	土工集計表・計算書
			上層路盤	M-40 t=8cm	m2	284	258+22.6+3.1 = 283.7	土工集計表・計算書
			表層	再生密粒度AS(13) t=4cm	m2	285	258+23.6+3.1 = 284.7	土工集計表・計算書
	仮設費							
		交通管理工						
			交通誘導員	交通誘導員B	人	104	104.0 = 104.0	交通誘導員算定表
共通仮設								

数量総括表

当初：黒字
変更：赤字

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計算式	摘要
	共通仮設費							
		運搬費						
			仮設材運搬	仮設材運搬(往路)	式	1	1.0 = 1.0	積上運搬費数量計算書
				仮設材運搬(復路)	式	1	1.0 = 1.0	積上運搬費数量計算書
				仮設材積込・取卸 基地～現場	式	1	1.0 = 1.0	積上運搬費数量計算書
				仮設材積込・取卸 現場～基地	式	1	1.0 = 1.0	積上運搬費数量計算書
		準備費						
			試掘	N2市道部	箇所	6	4+1+1 = 6.0	MH箇所+曲部箇所
		事業損失防止施設費						
			工損調査	工損調査(5軒/日)	軒	19	19.0 = 19.0	取付管・家屋調査
		技術管理費						
			土質試験	土の一軸圧縮試験 JIS A 1216	試料	3	288.6/100 = 2.9	
				締固めた土のコーン指数試験	試料	2	(350.8+13.5)/200 = 1.8	
			本管TVカメラ調査工	内径150～800mm未満 新管 0.05回/ｍ以下	ｍ	284	284.1 = 284.1	
			取付管TVカメラ調査工	内径100～200mm未満 新管	箇所	9	8+1 = 9.0	
			報告書作成	本管TVカメラ調査 新管 0.05回/ｍ以下	ｍ	284	284.1 = 284.1	
			報告書作成	取付管TVカメラ調査 新管	箇所	9	8+1 = 9.0	

1号マンホール 底部工 数量計算書

上段：当初
下段：變更

[illegible]

積上運搬費 数量計算書

上段：当初
下段：変更

細別	規格	算式	数量
(往路)			
建込簡易土留	H=2.0m～3.5m	14.6 = 14.60	14.6 t
			t
			t
			t
往路重量計		14.6 = 14.60	14.6 t
(復路)			
建込簡易土留	H=2.0m～3.5m	14.6 = 14.60	14.6 t
			t
			t
			t
復路重量計		14.6 = 14.60	14.6 t
建込簡易土留	H=2.0m～3.5m		
補助対象事業分	土留面積（片側）	$1.5 \times 0 + 2 \times 144.57 + 2.5 \times 109.9 + 0 + 3 \times 0 + 0 + 3.5 \times 0 + 0 = 563.89$	563.9 m ²
単独対象事業分	土留面積（片側）		m ²
計	土留面積（片側）	563.9+0 = 563.90	563.9 m ²
平均土留高	土留面積÷延長	$563.9 / (0 + 144.57 + 109.9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) = 2.22$	2.2 m
土留材重量	H=2.5m 基材セット30m	14.6 = 14.60	14.6 t
補助対象事業分		$14.6 \times 563.9 / 563.9 = 14.60$	14.6 t
単独対象事業分			t

水替日数 数量計算書

上段：当初
下段：變更

[illegible]

土工集計表(建込簡易土留)

上段：当初
下段：變更

[illegible]

番号			1	2	3
路線番号			56	64	65
本管	管種		PRP φ 150	PRP φ 150	PRP φ 150
延長	区間		38. 70	72. 20	9. 00
上流	測点		56-1	64-1	65-1
			1号MH	1号MH	1号MH
	地盤高		13. 15	13. 18	12. 25
	管底高		11. 562	11. 392	10. 318
下流	測点		65-1	65-1	65-2
			1号MH	1号MH	
	地盤高		12. 25	12. 25	12. 07
	管底高		11. 092	10. 338	10. 287
掘削	厚	基礎	0. 15	0. 15	0. 15
		既設舗装厚	0. 05	0. 05	0. 05
	幅	基礎下	0. 90	0. 90	0. 90
舗装撤去	切断回数		1	1	1
舗装復旧	復旧方法		仮復旧	仮復旧	仮復旧
	復旧断面		市道N2	市道N2	市道N2
舗装復旧厚	下層		0. 20	0. 20	0. 20
	上層(歩道路盤)		0. 08	0. 08	0. 08
	基層				
	中間層				
	表層		0. 04	0. 04	0. 04
材料	埋戻	管保護部	再生改良土	再生改良土	再生改良土
		埋戻部	再生改良土	再生改良土	再生改良土
	管基礎		碎石	碎石	碎石
延長	MH分減延長	下流分	0. 45	0. 45	0. 45
		上流分	0. 45	0. 45	
	管渠		37. 80	71. 30	8. 55
平均掘削深			1. 53	2. 01	2. 02
建込簡易土留高			H=2. 0m	H=2. 5m	H=2. 5m
掘削	厚	予掘	0. 95	0. 95	0. 95
		本掘	0. 53	1. 01	1. 02
	幅		0. 90	0. 90	0. 90
	土量	予掘	33. 09	61. 73	7. 70
		本掘	18. 48	65. 47	8. 22
埋戻	厚	管保護部	0. 27	0. 27	0. 27
		埋戻部	0. 80	1. 27	1. 28
	幅		0. 90	0. 90	0. 90
	土量	管保護部	8. 44	15. 72	1. 97
		埋戻部	27. 71	82. 69	10. 37
		計	36. 14	98. 41	12. 33
管基礎	幅		0. 90	0. 90	0. 90
	数量		5. 10	9. 63	1. 15
舗装撤去	幅		0. 90	0. 90	0. 90
	切断		77. 40	144. 40	18. 00
	破碎		34. 83	64. 98	8. 10
	運搬処理		1. 74	3. 25	0. 41
舗装復旧	下層	幅	0. 90	0. 90	0. 90
		面積	34. 49	64. 64	7. 93
	上層・歩道路盤	幅	0. 90	0. 90	0. 90
		面積	34. 49	64. 64	7. 93
	表層	幅	0. 90	0. 90	0. 90
		面積	34. 49	64. 64	7. 93

番号			4	5	6	7
路線番号			65	65	67	
本管	管種		PRP φ 150	PRP φ 150	PRP φ 150	
延長	区間		58.00	82.00	28.70	
上流	測点		65-2	65-3	67-1	
				1号MH	1号MH	
	地盤高		12.07	11.60	11.51	
	管底高		10.287	10.064	9.757	
下流	測点		65-3	67-1	79-1	
			1号MH	1号MH	1号MH	
	地盤高		11.60	11.51	11.63	
	管底高		10.084	9.777	9.657	
掘削	厚	基礎	0.15	0.15	0.15	
		既設舗装厚	0.05	0.05	0.05	
	幅	基礎下	0.90	0.90	0.90	
舗装撤去	切断回数		1	1	1	
舗装復旧	復旧方法		仮復旧	仮復旧	仮復旧	
	復旧断面		市道N2	市道N2	市道N2	
舗装復旧厚	下層		0.20	0.20	0.20	
	上層(歩道路盤)		0.08	0.08	0.08	
	基層					
	中間層					
	表層		0.04	0.04	0.04	
材料	埋戻	管保護部	再生改良土	再生改良土	再生改良土	
		埋戻部	再生改良土	再生改良土	再生改良土	
	管基礎		碎石	碎石	碎石	
延長	MH分減延長	下流分		0.45	0.45	
		上流分	0.45	0.45	0.45	
	管渠		57.55	81.10	27.80	
平均掘削深			1.81	1.79	2.02	
建込簡易土留高			H=2.0m	H=2.0m	H=2.5m	
掘削	厚	予掘	0.95	0.95	0.95	
		本掘	0.81	0.79	1.02	
	幅		0.90	0.90	0.90	
	土量	予掘	49.59	70.11	24.54	
		本掘	42.13	58.45	26.36	
埋戻	厚	管保護部	0.27	0.27	0.27	
		埋戻部	1.07	1.06	1.29	
	幅		0.90	0.90	0.90	
	土量	管保護部	12.62	17.85	6.26	
		埋戻部	55.96	78.01	33.20	
		計	68.58	95.86	39.47	
管基礎	幅		0.90	0.90	0.90	
	数量		7.77	10.95	3.75	
舗装撤去	幅		0.90	0.90	0.90	
	切断		116.00	164.00	57.40	
	破碎		52.20	73.80	25.83	
	運搬処理		2.61	3.69	1.29	
舗装復旧	下層	幅	0.90	0.90	0.90	
		面積	52.03	73.46	25.49	
	上層・歩道路盤	幅	0.90	0.90	0.90	
		面積	52.03	73.46	25.49	
	表層	幅	0.90	0.90	0.90	
		面積	52.03	73.46	25.49	

管きょ 数量表

PRP φ150

上段：当初
下段：変更

番号	路線番号	区間		路線延長	管布設工				埋設表示		管止 キャップ
		上流測点	下流測点		延長	減長	上流	下流	シート	テープ	
合計				288. 6	284. 1				284. 1	360. 8	
1	56	56-1	～ 65-1	38. 70	37. 80	0. 90	1号MH	1号MH	37. 80	48. 11	
2	64	64-1	～ 65-1	72. 20	71. 30	0. 90	1号MH	1号MH	71. 30	90. 29	
3	65	65-1	～ 65-2	9. 00	8. 55	0. 45	1号MH		8. 55	11. 28	
4	65	65-2	～ 65-3	58. 00	57. 55	0. 45		1号MH	57. 55	72. 98	
5	65	65-3	～ 67-1	82. 00	81. 10	0. 90	1号MH	1号MH	81. 10	102. 63	
6	67	67-1	～ 79-1	28. 70	27. 80	0. 90	1号MH	1号MH	27. 80	35. 52	
7			～								
8			～								
9			～								
10			～								

自然流下管 PRP φ150

位置	リブバンド管				
	5°	10°	22° 1/2		
65-1 ~ 65-2	1				
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
~					
	1				

1号マンホール 数量計算表

上段：当初
下段：變更

[illegible]

内副管設置工 数量計算書

上段：当初
下段：變更

[illegible]

土工集計表(取付管 素掘)

上段：当初
下段：变更

		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

土工計算書(取付管 素掘)

当初：黒字(左欄)
変更：赤字(右欄)

番号			1	2	3
路線番号・所有者			64-①	64-②	64-③
取付管	管種		VUφ100	VUφ100	VUφ100
ます	形状	横	横	横	横
	流入管深さ	0.90	1.00	1.00	
延長	取付管	4.15	2.94	3.96	
	民地内	0.50	0.50	0.50	
本管掘削幅(平均幅)			0.90	0.90	0.90
掘削	厚	ます深	0.90	1.00	1.00
		基礎	0.10	0.10	0.10
		既設舗装厚	0.05	0.05	0.05
	幅	基礎下	0.55	0.55	0.55
舗装撤去	切断回数		1	1	1
舗装復旧	復旧方法		仮復旧	仮復旧	仮復旧
	復旧断面		市道N2	市道N2	市道N2
舗装復旧厚	下層		0.20	0.20	0.20
	上層(歩道路盤)		0.08	0.08	0.08
	基層				
	中間層				
	表層		0.04	0.04	0.04
宅内	撤去・復旧		表土	表土	表土
	汚水ます蓋		樹脂	樹脂	樹脂
土 質			岩盤又は堅い粘土層8以上	岩盤又は堅い粘土層8以上	岩盤又は堅い粘土層8以上
材料	埋戻	取付管	再生改良土	再生改良土	再生改良土
延長	本管掘削分減		0.45	0.45	0.45
	掘削・埋戻	取付管	3.20	1.99	3.01
		ます	1.00	1.00	1.00
平均掘削深			1.02	1.11	1.12
掘削	厚	取付管	0.97	1.06	1.07
		ます	1.00	1.10	1.10
	掘削勾配		0.3	0.3	0.3
	平均幅	取付管	0.84	0.87	0.87
		ます	0.50	0.50	0.50
	土量	取付管	2.61	1.84	2.80
		ます	0.50	0.55	0.55
埋戻	厚	取付管	0.60	0.69	0.70
		ます	0.90	1.00	1.00
	平均幅	取付管	0.79	0.82	0.82
		ます	0.50	0.50	0.50
	土量	取付管	1.48	1.11	1.69
		ます	0.45	0.50	0.50
埋設表示	シート		4.15	2.94	3.96
	テープ		5.25	3.82	5.03
舗装撤去	幅	舗装面	1.16	1.22	1.22
	切断		6.40	3.98	6.02
	破碎		3.72	2.42	3.67
	運搬処理		0.19	0.12	0.18
舗装復旧	下層	幅	1.03	1.09	1.09
		面積	3.29	2.16	3.28
	上層・歩道路盤	幅	1.11	1.17	1.17
		面積	3.56	2.33	3.53
	表層	幅	1.16	1.22	1.22
面積		3.72	2.42	3.67	
宅内	基礎復旧	厚			
		面積			
	表層撤去復旧	厚			
		面積			

土工計算書(取付管 素掘)

当初：黒字(左欄)
変更：赤字(右欄)

番号			4	5	6
路線番号・所有者			64-④	64-⑤	65-①
取付管	管種		VUφ100	VUφ100	VUφ100
ます	形状		横	横	横
	流入管深さ		0.90	0.90	0.90
延長	取付管		3.84	2.90	3.95
	民地内		0.50	0.50	0.50
本管掘削幅(平均幅)			0.90	0.90	0.90
掘削	厚	ます深	0.90	0.90	0.90
		基礎	0.10	0.10	0.10
		既設舗装厚	0.05	0.05	0.05
	幅	基礎下	0.55	0.55	0.55
舗装撤去	切断回数		1	1	1
舗装復旧	復旧方法		仮復旧	仮復旧	仮復旧
	復旧断面		市道N2	市道N2	市道N2
舗装復旧厚	下層		0.20	0.20	0.20
	上層(歩道路盤)		0.08	0.08	0.08
	基層				
	中間層				
	表層		0.04	0.04	0.04
宅内	撤去・復旧		表土	表土	表土
	汚水ます蓋		樹脂	樹脂	樹脂
土 質			岩盤又は堅い粘土N値8以上	岩盤又は堅い粘土N値8以上	岩盤又は堅い粘土N値8以上
材料	埋戻	取付管	再生改良土	再生改良土	再生改良土
延長	本管掘削分減		0.45	0.45	0.45
	掘削・埋戻	取付管	2.89	1.95	3.00
		ます	1.00	1.00	1.00
平均掘削深			1.02	1.01	1.02
掘削	厚	取付管	0.97	0.96	0.97
		ます	1.00	1.00	1.00
	掘削勾配		0.3	0.3	0.3
	平均幅	取付管	0.84	0.84	0.84
		ます	0.50	0.50	0.50
	土量	取付管	2.35	1.57	2.44
		ます	0.50	0.50	0.50
埋戻	厚	取付管	0.60	0.59	0.60
		ます	0.90	0.90	0.90
	平均幅	取付管	0.79	0.79	0.79
		ます	0.50	0.50	0.50
	土量	取付管	1.33	0.89	1.38
		ます	0.45	0.45	0.45
埋設表示	シート		3.84	2.90	3.95
	テープ		4.89	3.78	5.01
舗装撤去	幅	舗装面	1.16	1.16	1.16
	切断		5.78	3.90	6.00
	破碎		3.35	2.26	3.48
	運搬処理		0.17	0.11	0.17
舗装復旧	下層	幅	1.03	1.03	1.03
		面積	2.97	2.00	3.09
	上層・歩道路盤	幅	1.11	1.11	1.11
		面積	3.21	2.16	3.34
	表層	幅	1.16	1.16	1.16
	面積	3.35	2.26	3.48	
宅内	基礎復旧	厚			
		面積			
	表層撤去復旧	厚			
		面積			

土工計算書(取付管 素掘)

当初：黒字(左欄)
変更：赤字(右欄)

番号			7	8		
路線番号・所有者			65-②	65-③		
取付管	管種		VUφ100	VUφ100		
ます	形状		横	横		
	流入管深さ		0.90	1.00		
延長	取付管		3.76	2.12		
	民地内		0.50	0.50		
本管掘削幅(平均幅)			0.90	0.90		
掘削	厚	ます深	0.90	1.00		
		基礎	0.10	0.10		
		既設舗装厚	0.05	0.05		
	幅	基礎下	0.55	0.55		
舗装撤去	切断回数		1	1		
舗装復旧	復旧方法		仮復旧	仮復旧		
	復旧断面		市道N2	市道N2		
舗装復旧厚	下層		0.20	0.20		
	上層(歩道路盤)		0.08	0.08		
	基層					
	中間層					
	表層		0.04	0.04		
宅内	撤去・復旧		表土	表土		
	汚水ます蓋		樹脂	樹脂		
土 質			岩盤又は堅い粘土層8以上	岩盤又は堅い粘土層8以上		
材料	埋戻	取付管	再生改良土	再生改良土		
延長	本管掘削分減		0.45	0.45		
	掘削・埋戻	取付管	2.81	1.17		
		ます	1.00	1.00		
平均掘削深			1.02	1.11		
掘削	厚	取付管	0.97	1.06		
		ます	1.00	1.10		
	掘削勾配		0.3	0.3		
	平均幅	取付管	0.84	0.87		
		ます	0.50	0.50		
	土量	取付管	2.28	1.07		
		ます	0.50	0.55		
埋戻	厚	取付管	0.60	0.69		
		ます	0.90	1.00		
	平均幅	取付管	0.79	0.82		
		ます	0.50	0.50		
	土量	取付管	1.29	0.65		
		ます	0.45	0.50		
埋設表示	シート		3.76	2.12		
	テープ		4.79	2.86		
舗装撤去	幅	舗装面	1.16	1.22		
	切断		5.62	2.34		
	破碎		3.26	1.42		
	運搬処理		0.16	0.07		
舗装復旧	下層	幅	1.03	1.08		
		面積	2.89	1.27		
	上層・歩道路盤	幅	1.11	1.17		
		面積	3.12	1.37		
	表層	幅	1.16	1.22		
		面積	3.26	1.42		
宅内	基礎復旧	厚				
		面積				
	表層撤去復旧	厚				
		面積				

上段：当初
下段：变更

[illegible]

土工計算書(取付管 建込簡易土留)

番号			1				
路線番号・所有者			65-④				
取付管	管種		VUφ100				
ます	形状		横				
	流入管深さ		1.50				
延長	取付管		4.57				
	民地内		0.50				
本管掘削幅(平均幅)			0.90				
掘削	厚	ます深	1.50				
		基礎	0.10				
		既設舗装厚	0.05				
	幅	基礎下	0.85				
舗装撤去	切断回数		1				
舗装復旧	復旧方法		仮復旧				
	復旧断面		市道N2				
舗装復旧厚	下層		0.20				
	上層(歩道路盤)		0.08				
	基層						
	中間層						
	表層		0.04				
宅内	撤去・復旧		表土				
	汚水ます蓋		樹脂				
材料	埋戻	取付管	再生改良土				
延長	本管掘削分減		0.45				
	掘削・埋戻	取付管	3.62				
		ます	1.00				
平均掘削深			1.62				
建込簡易土留高			H=2.0m				
掘削	厚	取付管 予掘	0.95				
		取付管 本掘	0.57				
		ます	1.60				
	幅	取付管	0.85				
		ます	0.50				
	土量	取付管 予掘	2.92				
		取付管 本掘	1.76				
		ます	0.80				
埋戻	厚	取付管	1.20				
		ます	1.50				
	幅	取付管	0.85				
		ます	0.50				
	土量	取付管	3.66				
		ます	0.75				
埋設表示	シート		4.57				
	テープ		5.75				
舗装撤去	幅	舗装面	0.85				
	切断		7.24				
	破碎		3.08				
	運搬処理		0.15				
舗装復旧	下層	幅	0.85				
		面積	3.08				
	上層・歩道路盤	幅	0.85				
		面積	3.08				
	表層	幅	0.85				
		面積	3.08				
宅内	基礎復旧	厚					
		面積					
	表層撤去復旧	厚					
		面積					


試掘工(市道N2・仮復旧) 1箇所当たり概算数量

細別	規格	算式	数量
掘削		$((1-1.2*0.1*2+1)/2)*((1.2-1.2*0.1*2+1.2)/2)*(1.2-0.05) =$	1.10
埋戻(埋戻)	発生土	$((((1-1.2*0.1*2)+(1-(1.2-0.04-0.08-0.2)*0.1*2))/2)*(((1.2-1.2*0.1*2)+(1.2-(0.04-0.08-0.2)*0.1*2))/2)*(1.2-0.04-0.08-0.2) =$	0.8
土砂等運搬	2t、L=4.0km	$1.1-0.8/0.9 =$	0.2
舗装版切断	t≤15cm	$1.0*2+1.2*2 =$	4.4
舗装版破碎	t≤15cm	$1.2*1 =$	1.2
殻運搬	2t、L=28.2km	$1.2*1.0*0.05 =$	0.1
殻処分	日本海アスコン	$0.10 =$	0.1
下層路盤	RC-40、t=20cm	$1 =$	1.0
上層路盤	M-40、t=8cm	$1 =$	1.0
表層	再生密粒度As13 t=4cm	$1 =$	1.0
交通誘導員	B	$0.5 =$	0.5

試掘標準図


(市道N2)

平面図




断面図

(仮復旧)

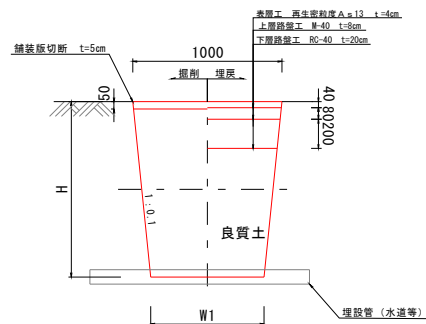

側面図

(仮復旧)

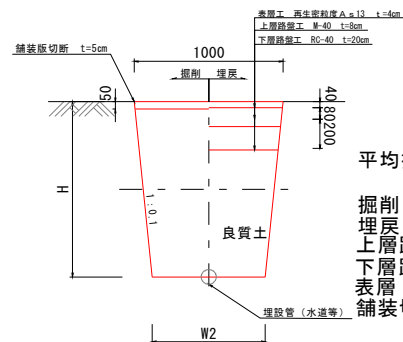

平均掘削深 H=1.2m

延長1.2m
掘削 V=1.1m³
埋戻 V=0.8m³
上層路盤 A=1.0m²
下層路盤 A=1.0m²
表層 A=1.0m²
舗装切断 L=4.4m

全体計画平面図

S=1:1000




凡 例		
マンホール名称		
	0 号	75cm
	1 号	90cm
	2 号	120cm
	3 号	150cm
	4 号	180cm
	特 1 号	60×90cm
	小口径（塩ビ）	30cm
	小口径（レジン）	30cm
	その他	
	マンホールポンプ （敷内にPを表示）	
公共ます名称		
	公共ます	20・30cm
埋設管名称		
	下水道管	
	圧 送 管	
既設埋設管名称		
	水 道 管	
	ガ ス 管	
	鉄筋コンクリート管	

令和 7 年度		図 番	4 葉 1
事業名	鶴岡市集落排水事業		
工事名	三瀬地区管路施設56～67号新設工事		
位 置	鶴岡市三瀬地内		
全体計画平面図		1 葉 1	
縮 尺 図 示		鶴 岡 市	


平面図

S=1:500

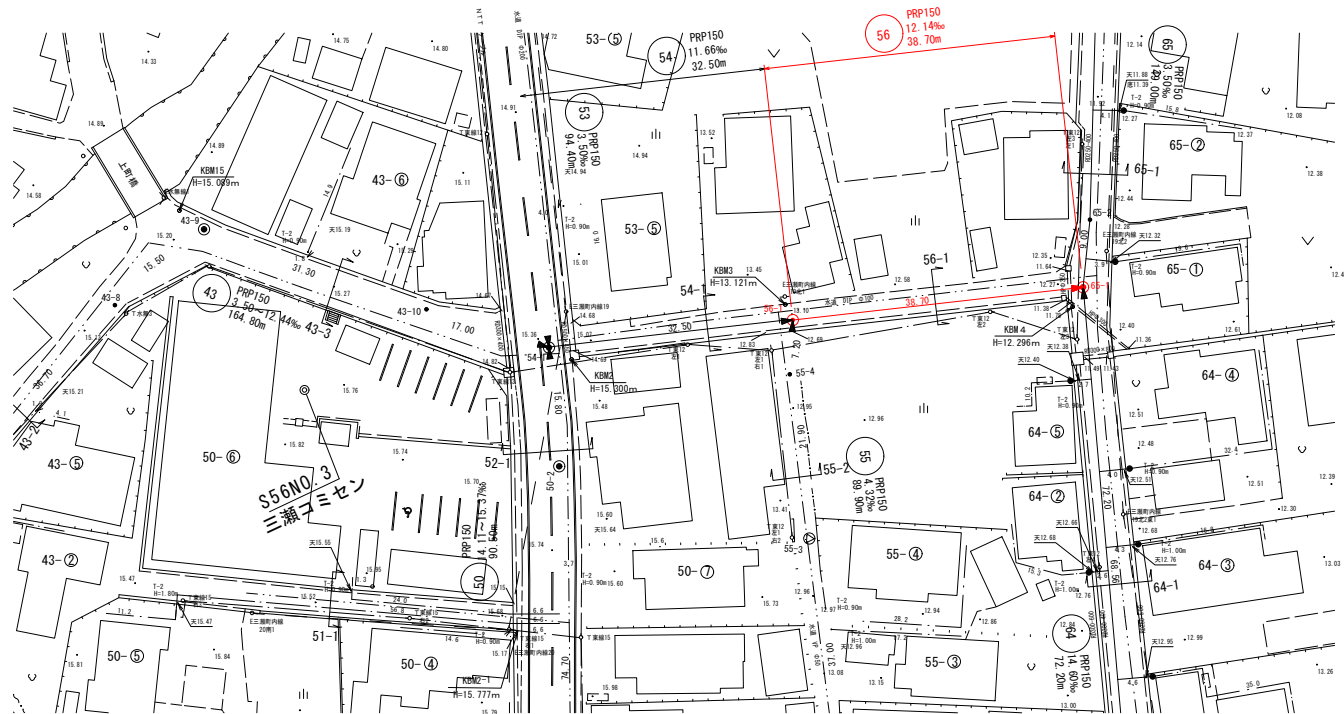


横断面図

S=1:100

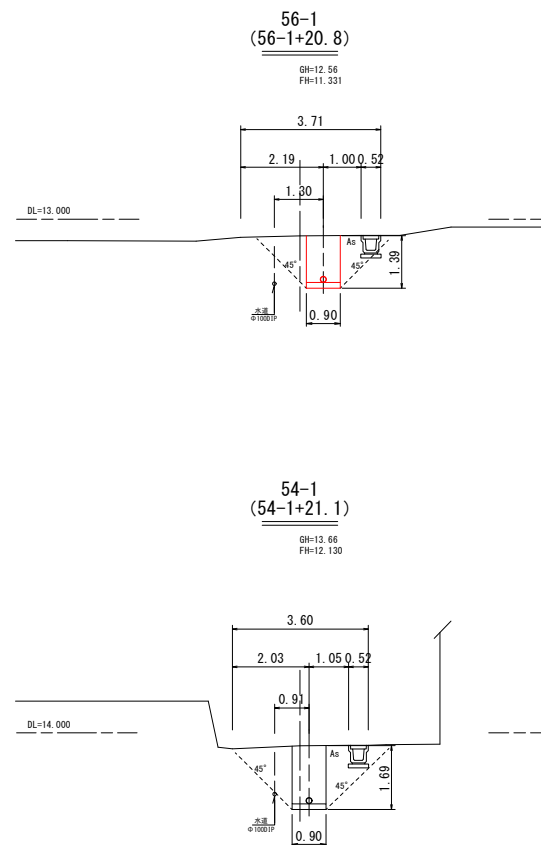

縦断面図

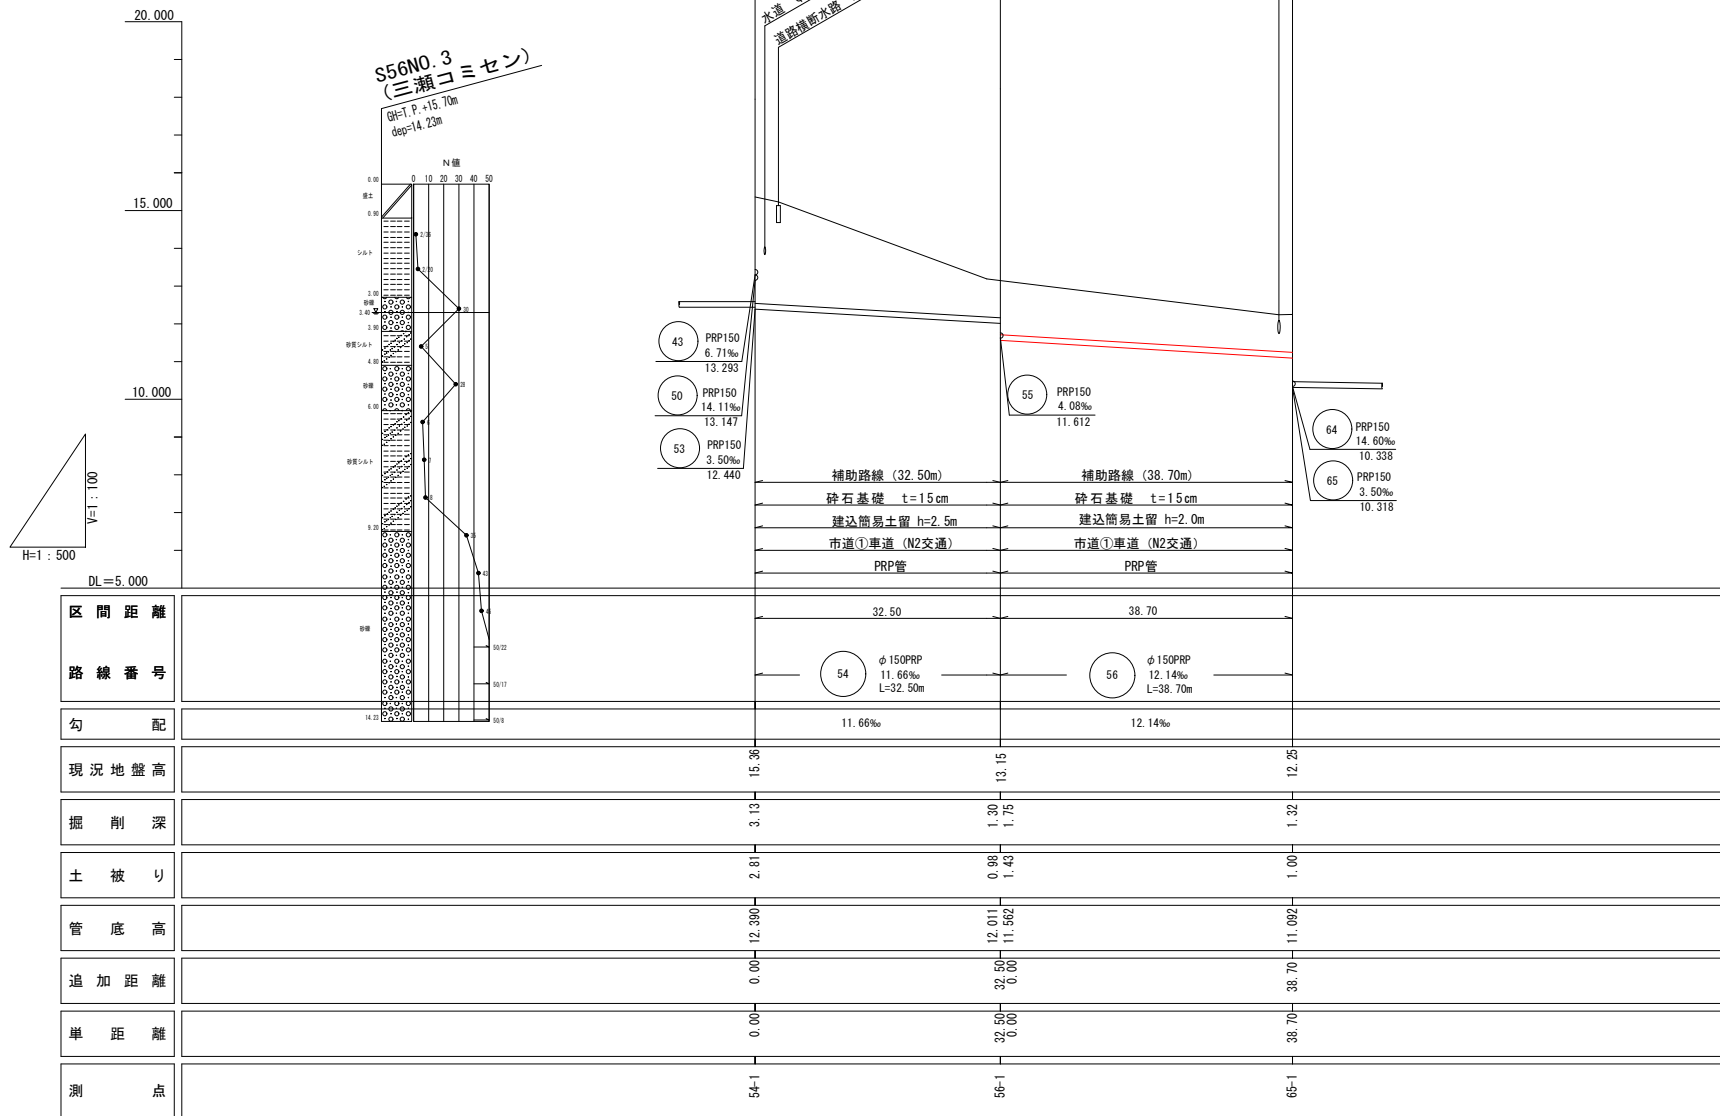


凡 例

マンホール名称		
0 号	75cm	
1 号	90cm	
2 号	120cm	
3 号	150cm	
4 号	180cm	
特 1 号	60×90cm	
小口径 (塩ビ)	30cm	
小口径 (レジン)	30cm	
その他		
P	マンホールポンプ (管内にPを敷設)	
公共ます名称		
公共ます	20×30cm	
埋設管名称		
下水道管		
圧送管		
既設埋設管名称		
水道管		
ガス管		
農業用パイプライン		

54 56

令和 7 年度		図 番	4 葉 2
事業名	鶴岡市集落排水事業		
工事名	三瀬地区管路施設56～67号新設工事		
位 置	鶴岡市三瀬地内		
54・56号 平面・縦断面図、横断面図			2 葉 1
縮 尺 図 示		鶴 岡 市	

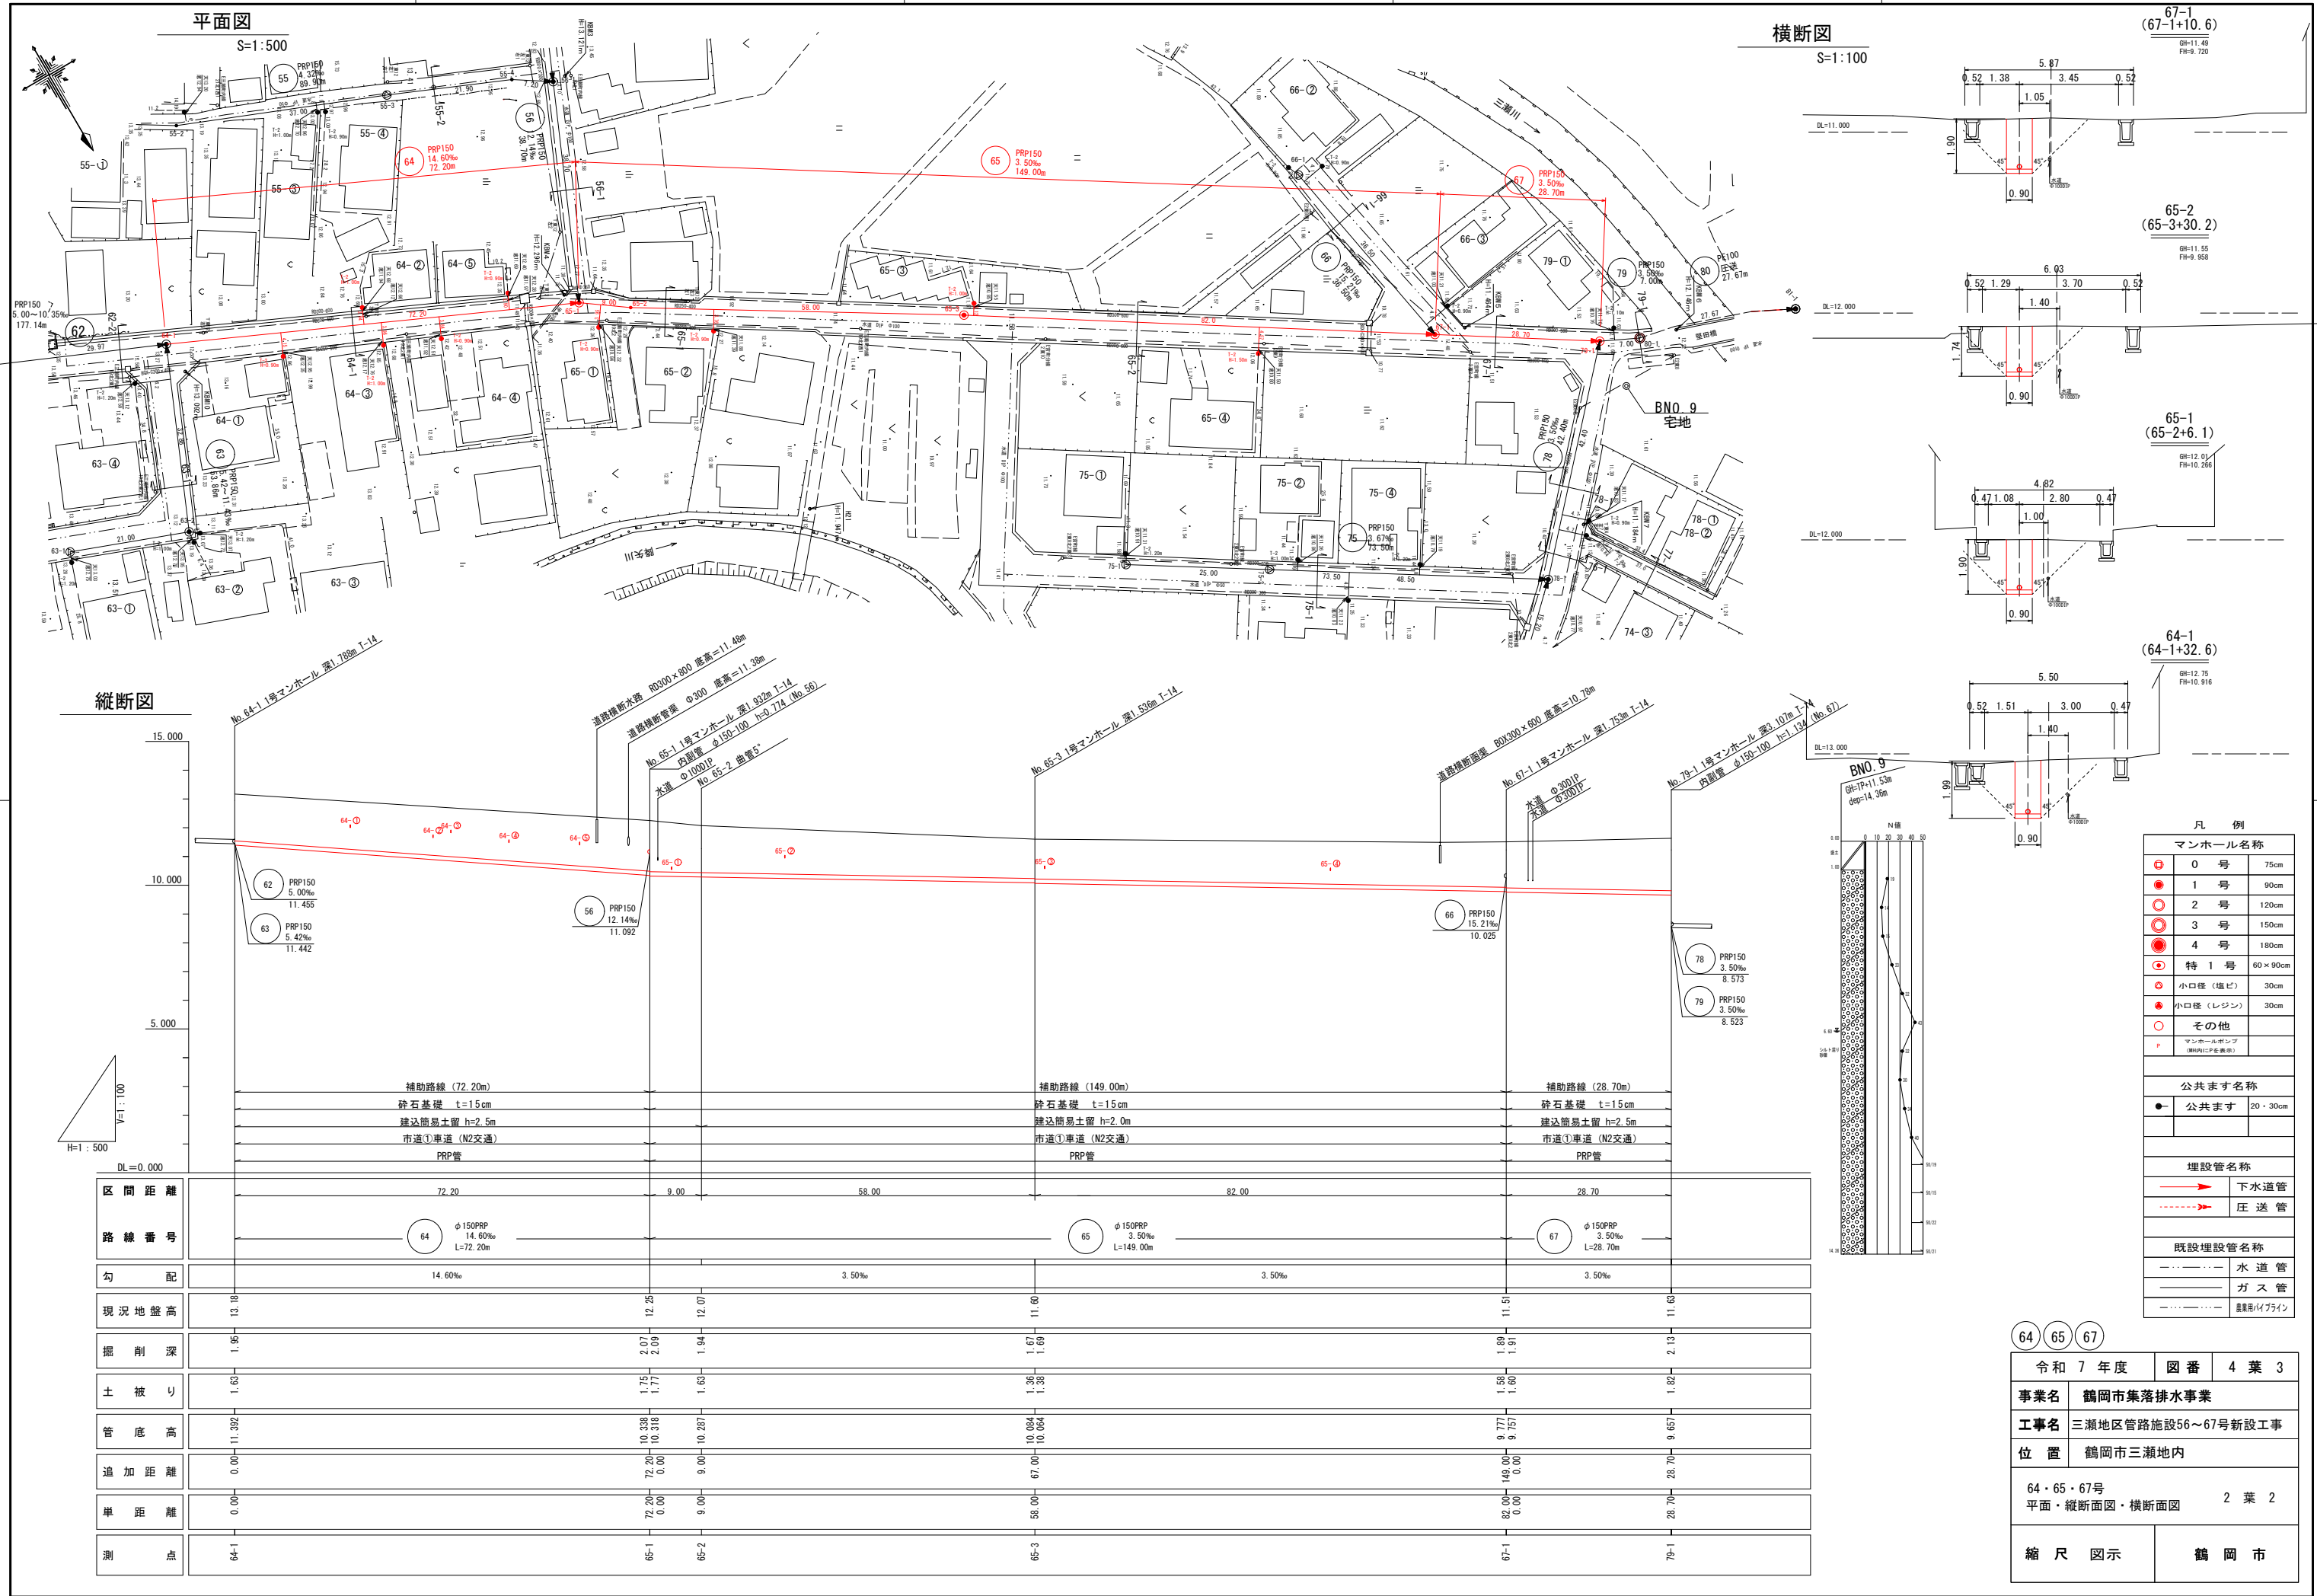


土工標準図（仮舗装復旧）

S=1:30


市道 N2 ①

建込簡易土留工法

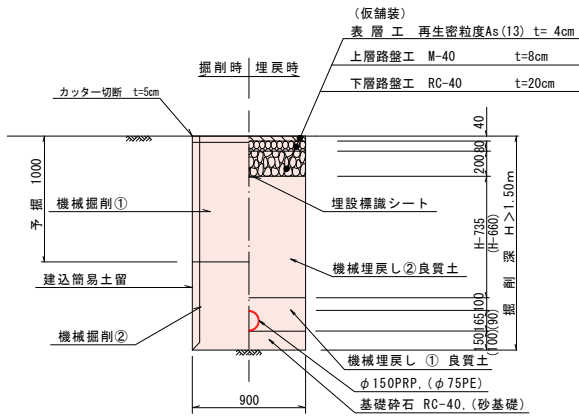

※（ ）内は、φ75PEの場合を示す。

素掘工法

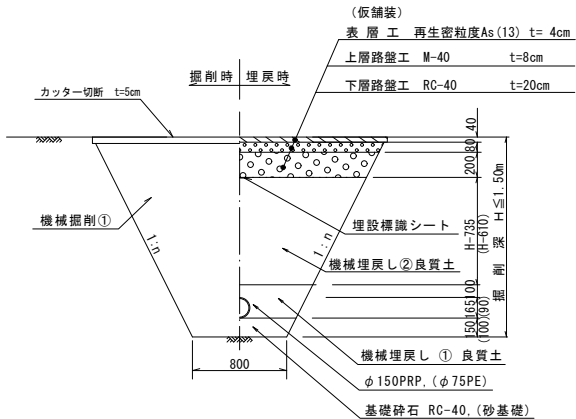


※（ ）内は、φ75PEの場合を示す。

本舗装復旧図

S=1:30

市道N2①本復旧

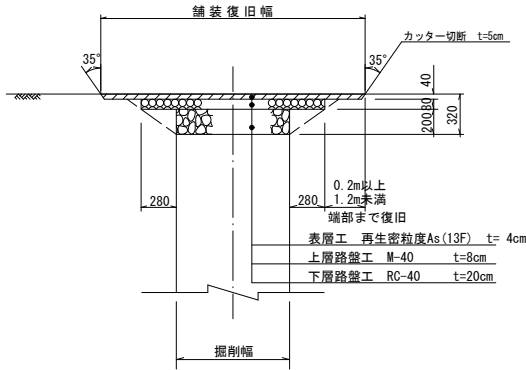

掘削勾配（土留工を使用しない場合）


地山の種類	法勾配（1：n）
岩盤又は固い粘土（N値8以上）	1：0.3
砂	1：1.0以上
その他	1：0.5

取付管土工図

S=1:30


市道N2①・N3②

建込簡易土留工法

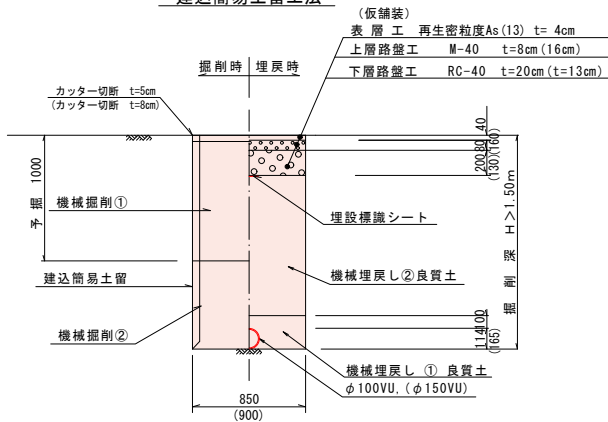

※（ ）内は、市道 N3 ②、φ150VUの場合を示す。

※ 取付管長が4m以上の場合、管基礎（丘砂・t=10mm）を施工。

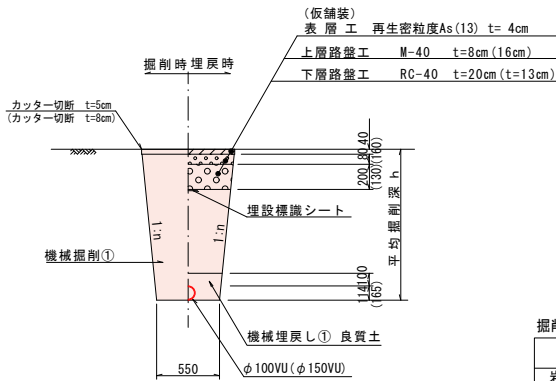

※（ ）内は、市道N3 ②、φ150VUの場合を示す。


※ 取付管長が4m以上の場合、管基礎（丘砂・t=10mm）を施工。

掘削勾配（土留工を使用しない場合）

地山の種類	法勾配（1：n）
岩盤又は固い粘土（N値8以上）	1：0.3
砂	1：1.0以上
その他	1：0.5

※ 素掘り掘削勾配 nは、掘削深 H > 1.0m は n=0.0
1.0m ≤ 掘削深 H < 1.5m は n=0.3
(地山の種類による)

歩道

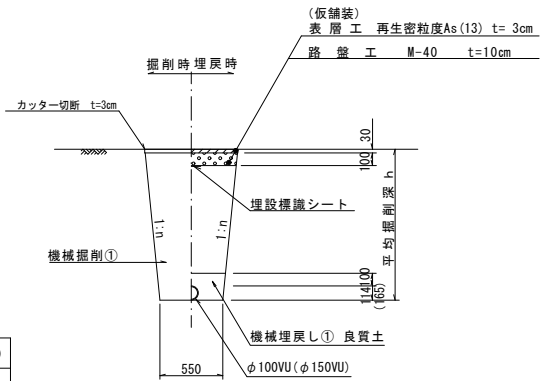

※（ ）内は、市道N3 ②、φ150VUの場合を示す。

※ 取付管長が4m以上の場合、管基礎（丘砂・t=10mm）を施工。

(特記事項)

※ 図面と現地が相違する場合は、監督職員と協議すること。

令和 7 年度	図番	4 葉 4
事業名	鶴岡市集落排水事業	
工事名	三瀬地区管路施設56～67号新設工事	
位置	鶴岡市三瀬地内	
土工標準図 (市道 N2 ①)		1 葉 1
縮尺 1：30	鶴岡市	
